



รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



กองแผนงาน
ส่วนติดตามและประเมินผล

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568

บทสรุปผู้บริหาร

กรมชลประทานได้ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางของรัฐบาลที่สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 ผลการใช้จ่าย จำนวน 82,806.5152 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100.07 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 72,631.2788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78 โดยดำเนินงานทั้งสิ้น 27 ผลผลิต/โครงการ สรุปได้ดังนี้

1. ผลผลิต/โครงการที่เบิกจ่ายได้มากกว่าร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม (ร้อยละ 87.78) มีจำนวน 16 ผลผลิต/โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ทำให้โครงการดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณได้มากกว่าร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานปีเดียวที่ดำเนินการเอง และวงเงินงบประมาณไม่สูงมากนัก ทำให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เร็ว ส่งผลให้เบิกจ่ายได้สูง หรือเป็นงานผูกพันเดิมซึ่งมีสัญญาอยู่แล้ว และการเบิกจ่ายตามงวดงาน จึงสามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา/งวดงาน พร้อมทั้งมีการเร่งรัดปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. ผลผลิต/โครงการที่เบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม มีจำนวน 11 โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้โครงการดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม เนื่องจาก

2.1 ระเบียบกฎหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน

2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำมีผลกระทบหลายด้าน เช่น ราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินการ บางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่หรือไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน และสภาพพื้นที่หรือการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหรือเพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ ส่งผลทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา เป็นต้น

2.3 ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

2.4 ส่วนใหญ่เป็นงานปีเดียวที่เป็นงานจ้างเหมา หรืองานผูกพันใหม่ และวงเงินงบประมาณสูง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการซื้อจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งมีเงื่อนไขและระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญา และต้องสอดคล้องไปกับการดำเนินการก่อสร้าง หรือมีเบิกจ่ายงวดเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	27.46	38.22
จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	967,934	693,948
จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	107.40	82.23
จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	208,638	175,325
จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ไร่	436,639	296,113
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	2,214,707	1,960,176

นอกจากนี้ ตรวจสอบแล้วพบว่า งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายการงานที่ยกเลิก จำนวน 213 รายการ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 1,152.3682 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการซ้ำซ้อน และได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของรายการงานที่ยกเลิก ได้แก่ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จำนวน 1,350 ไร่ ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 16,240 ไร่ ตัวชี้วัด : ปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 1.60 ล้านลูกบาศก์เมตร และตัวชี้วัด : ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 19,596 ครัวเรือน) แต่ทั้งนี้ กรมมีการปรับแผนการดำเนินงาน โดยนำงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย หรือยกเลิก มาดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ พบว่า หากมีการแจ้งคืนงบประมาณดังกล่าวเพื่อนำไปดำเนินการ โอนจัดสรร (เปลี่ยนแปลง) ถ่าช้า หรือใกล้สิ้นปีงบประมาณ จะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณลดลง โดยจะทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี ซึ่งจะเป็นการกันแบบมีหนี้ เสมือนมีหนี้ และเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 168 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 195 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568 หรือไม่สมารถนำไปดำเนินการโอนจัดสรร (เปลี่ยนแปลง) ได้ทันจึงทำให้ถูกพับ งบประมาณ

คำนำ

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ท่วถึง และเป็นธรรม ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึงนโยบายรัฐบาล ในมิติของการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และประเด็นของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท กิจกรรมที่ดำเนินงาน 1 ผลผลิต 26 โครงการ

ดังนั้น ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญแผนภาพ

1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
1.1 วิสัยทัศน์	1
1.2 พันธกิจ	1
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์	1
1.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย	2
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย	2
2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามแผนงาน	3
3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	8
3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	9
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
4. ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	14
4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	15
4.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกแผนงาน ตามผลผลิต/โครงการ	17
4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	17
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	17
4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	18
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	18
4.2.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	19
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	19
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	21
4.2.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	23
โครงการที่ 1 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	23
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	24
โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี	25
โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	26

โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	27
โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	28
โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	29
โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	30
โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	32
โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	34
โครงการที่ 11 : โครงการประจวบระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	35
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	36
โครงการที่ 13 : โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	37
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	38
โครงการที่ 15 : โครงการประจวบระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	39
โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	40
โครงการที่ 17 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	41
โครงการที่ 18 : โครงการประจวบระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	42
โครงการที่ 19 : โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	43
โครงการที่ 20 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	44
โครงการที่ 21 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง	45
โครงการที่ 22 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน	46
โครงการที่ 23 : โครงการปรับปรุงคลองชักแม่่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	47
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	48
6. การใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568	49
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	
7. สรุปผลการวิเคราะห์	53
ภาคผนวก	

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปภาพที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมชลประทาน	2
รูปภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนงบประมาณจำแนกตามแผนงาน	3
รูปภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำแนกรายโครงการ	4
รูปภาพที่ 4 แสดงสัดส่วนงบประมาณแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำแนกรายโครงการ	7
รูปภาพที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	8
รูปภาพที่ 6 แสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	8
รูปภาพที่ 7 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	9
รูปภาพที่ 8 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน	14

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	10
ตารางที่ 2 แสดงแผน - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	15
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	49

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (พ.ร.บ. 68) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1. ข้อมูลหน่วยงาน



วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580



พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทัวถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ



ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)



ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ


ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล และสามารถบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 208,638 ไร่
- ตัวชี้วัด : ปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 107.40 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ตัวชี้วัด : คราวเรือนได้รับประโยชน์ 2,214,707 คราวเรือน



2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมชลประทานได้ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางของรัฐบาลที่สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม (ดังรูปภาพที่ 1)

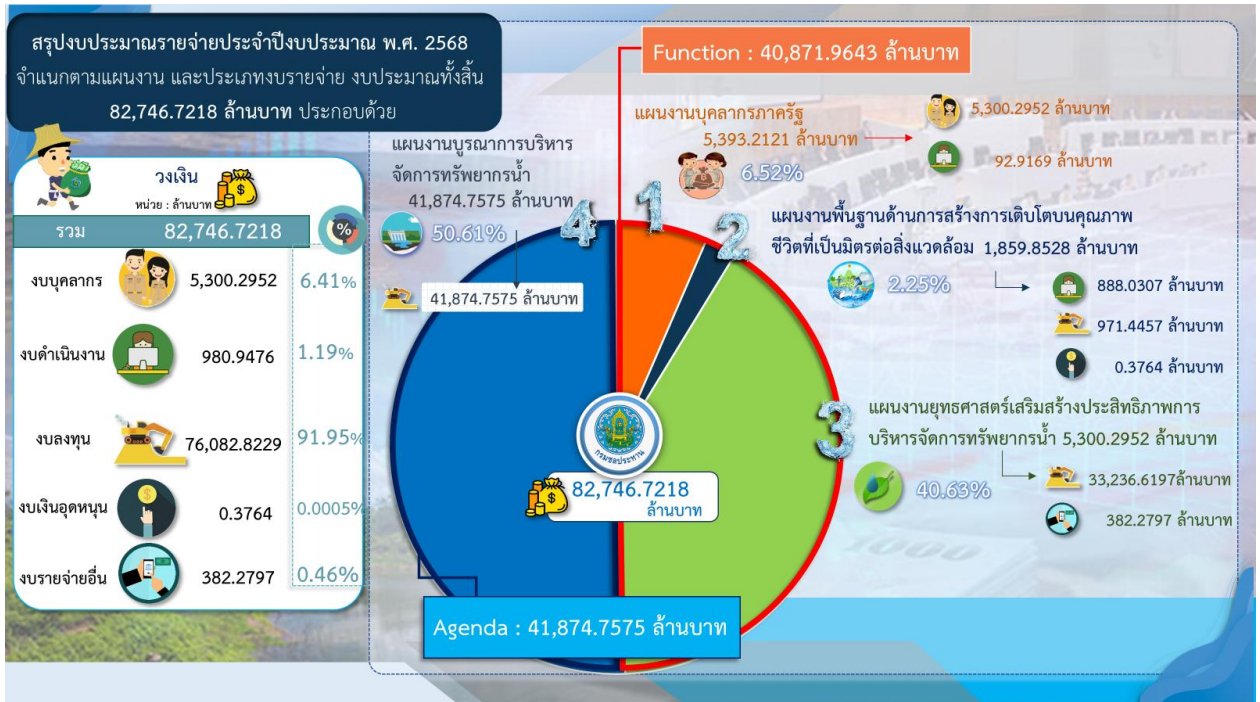

รูปภาพที่ 1 : แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ สามารถจำแนกงบประมาณตามประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท จำแนกการจัดสรรงบประมาณตามลักษณะรายจ่าย ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 6,422.3383 ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 76,324.3835 ล้านบาท

2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท จำแนกการจัดสรรงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย ดังนี้


- งบบุคลากร จำนวน 5,300.2952 ล้านบาท
- งบดำเนินงาน จำนวน 980.9476 ล้านบาท
- งบลงทุน จำนวน 76,082.8229 ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.3764 ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 382.2767 ล้านบาท

2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามแผนงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ (ดังรูปภาพที่ 2)

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 5,393.2121 ล้านบาท
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,859.8528 ล้านบาท
- แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 33,618.8994 ล้านบาท
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 41,874.7575 ล้านบาท


รูปภาพที่ 2 : แสดงสัดส่วนงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

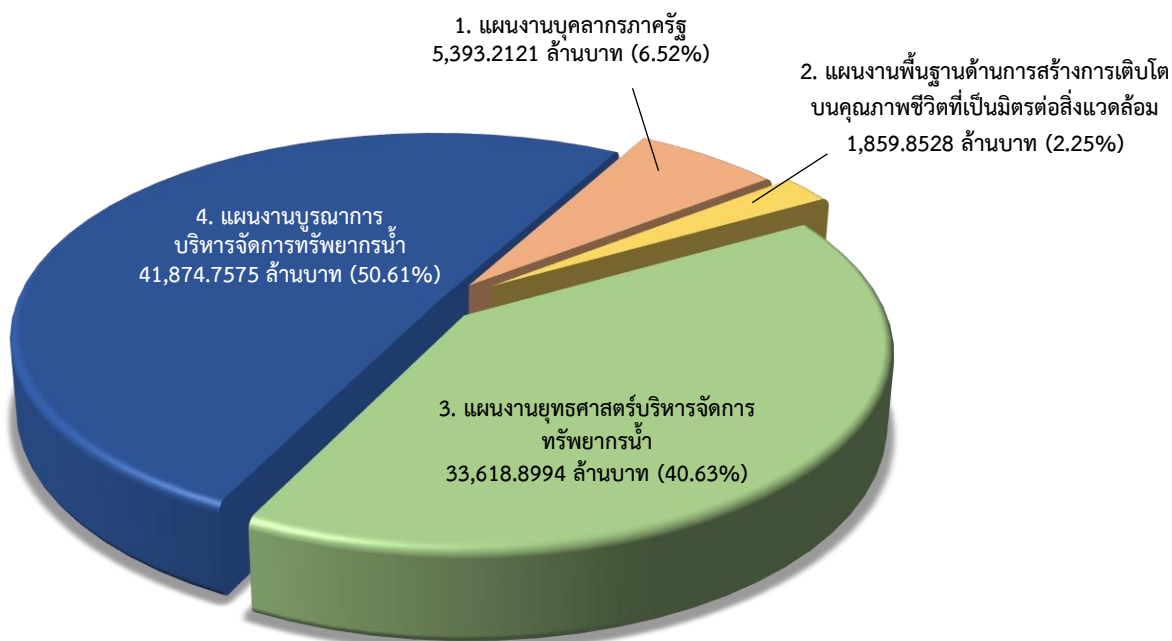

การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 5,393.2121 ล้านบาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,859.8528 ล้านบาท จำนวน 1 ผลผลิต ได้แก่ การจัดการงานชลประทาน
3. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 33,618.8994 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ (ดังรูปภาพที่ 3)
 - โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 11,458.5686 ล้านบาท
 - โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 2,883.7266 ล้านบาท
 - โครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 19,276.6042 ล้านบาท

รูปภาพที่ 3 : แสดงสัดส่วนงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำแนกรายโครงการ

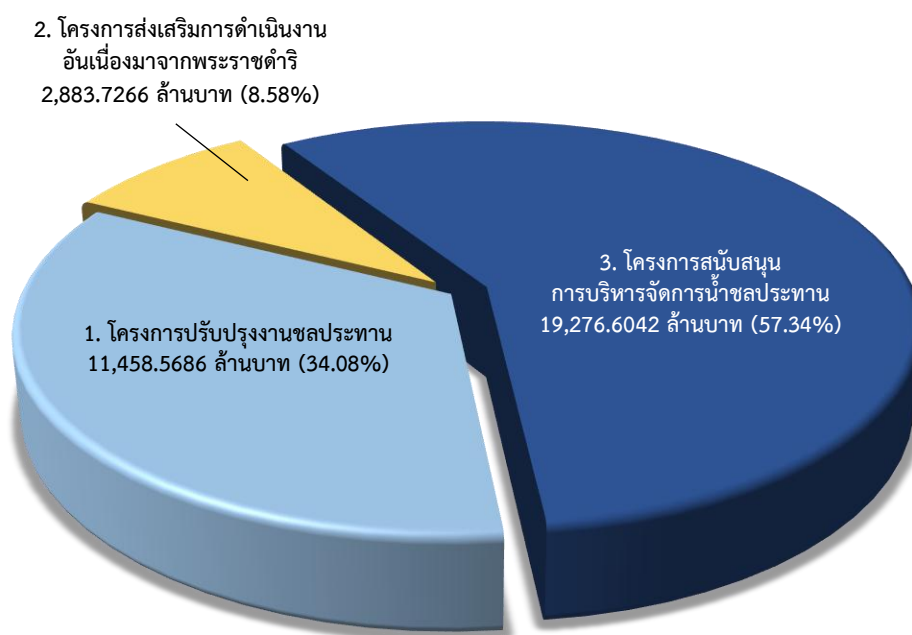

4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 41,874.7575 ล้านบาท จำนวน 23 โครงการ (ดังรูปภาพที่ 4)

- โครงการที่ 1 โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 42.7350 ล้านบาท
- โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 627.7433 ล้านบาท
- โครงการที่ 3 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 833.0773 ล้านบาท
- โครงการที่ 4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 144.3615 ล้านบาท
- โครงการที่ 5 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 66.8560 ล้านบาท
- โครงการที่ 6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 192.1459 ล้านบาท
- โครงการที่ 7 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,262.7196 ล้านบาท
- โครงการที่ 8 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 21,203.3308 ล้านบาท
- โครงการที่ 9 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 8,285.3540 ล้านบาท
- โครงการที่ 10 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 662.7340 ล้านบาท
- โครงการที่ 11 โครงการประตูละบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 455.2759 ล้านบาท
- โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 653.2666 ล้านบาท
- โครงการที่ 13 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 3,331.4765 ล้านบาท
- โครงการที่ 14 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 356.7000 ล้านบาท
- โครงการที่ 15 โครงการประตูละบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 101.9156 ล้านบาท
- โครงการที่ 16 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,260.7334 ล้านบาท
- โครงการที่ 17 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 556.9372 ล้านบาท



- โครงการที่ 18 โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
สกลนคร วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 164.5000 ล้านบาท
- โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.
จำนวน 624.4090 ล้านบาท
- โครงการที่ 20 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินงบประมาณตาม
พ.ร.บ. จำนวน 185.0000 ล้านบาท
- โครงการที่ 21 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.
จำนวน 673.5604 ล้านบาท
- โครงการที่ 22 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน
169.9255 ล้านบาท
- โครงการที่ 23 โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่ น้ำยมฝั่งขวา วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.
จำนวน 20.0000 ล้านบาท



3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


รูปภาพที่ 5 : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



กรมชลประทานได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณจำนวน 82,746.7218 ล้านบาท สิ้นไตรมาส 4 ผลการใช้จ่ายจำนวน 82,806.5152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.07 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 72,631.2788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ภาครัฐกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4

คิดเป็นร้อยละ 6.22 (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐ ร้อยละ 94.00) และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 4.58 (ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2567 ร้อยละ 83.20) (ดังรูปภาพที่ 6)

รูปภาพที่ 6 : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2568

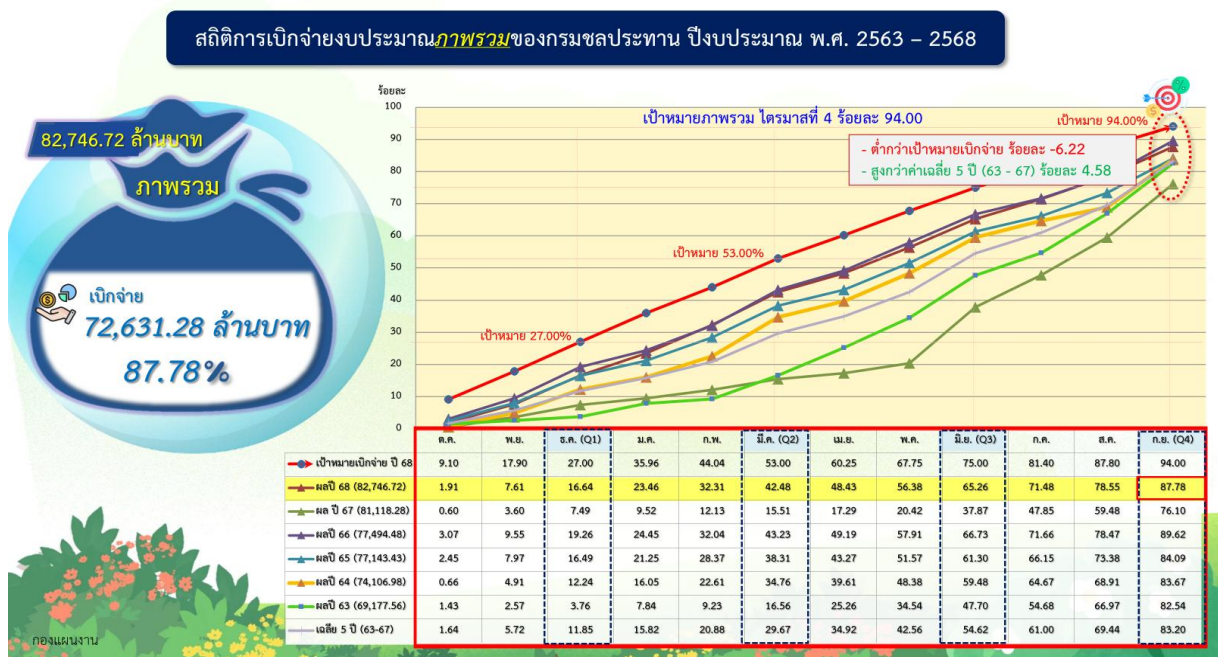


หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรมอยู่ในอันดับที่ 222 จาก 309 หน่วยงานทั่วประเทศที่ได้รับงบประมาณ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ ร้อยละ 4.74 (ค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายภาพรวมทั่วประเทศ ร้อยละ 92.52)

3.1 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 6,422.3383 ล้านบาท งบประมาณที่กรมได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 7,073.0429 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 ผลการใช้จ่าย จำนวน 7,207.1842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.90 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,115.0266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.59 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ภาครัฐกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 2.59 (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐร้อยละ 98.00)

งบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 76,324.3835 ล้านบาท งบประมาณที่กรมได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 75,673.6789 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย 75,599.3310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย จำนวน 65,516.2521 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.58 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 6.58 (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐร้อยละ 80.00) และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 5.06 (ค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ร้อยละ 81.52) (ดังรูปภาพที่ 7)

รูปภาพที่ 7 : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

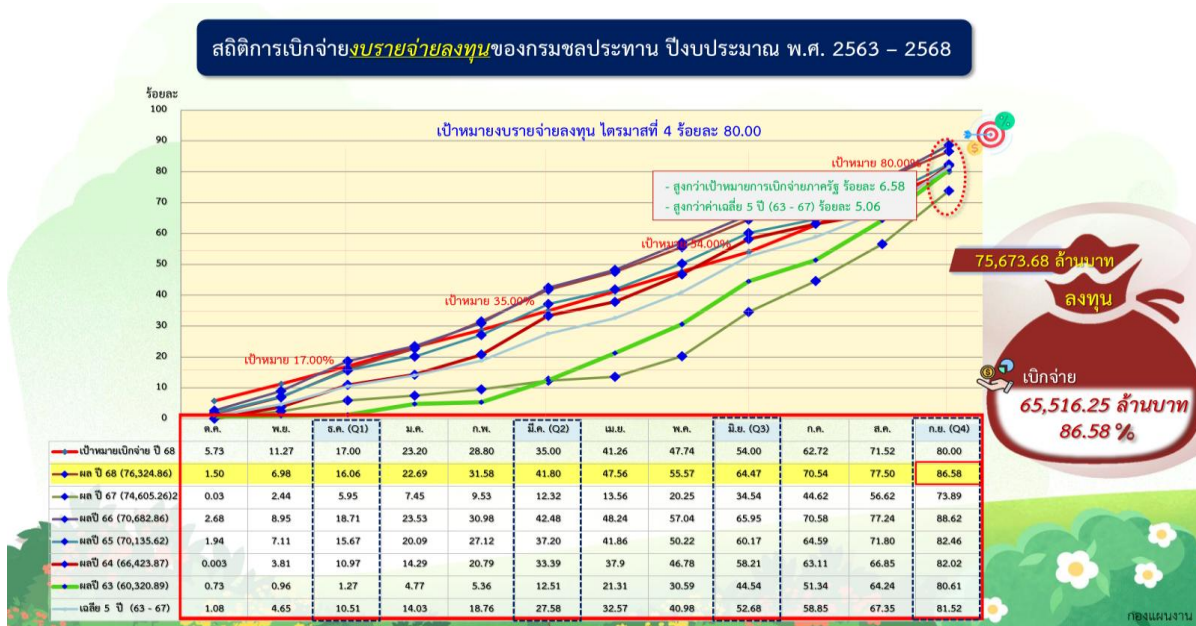


หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของกรมอยู่ในอันดับที่ 123 จาก 303 หน่วยงานทั่วประเทศ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานทั่วประเทศ ร้อยละ 16.10 (ค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนทั่วประเทศ ร้อยละ 70.48) และอยู่ในอันดับ 18 จาก 57 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ร้อยละ 16.18 (ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ร้อยละ 70.40)


3.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ


แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ	ประจำ				ลงทุน				รวม			
	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง
รวม	6,422.3383	7,073.0429	7,115.0266	100.59	76,324.3835	75,673.6789	65,516.2521	86.58	82,746.7218	82,746.7218	72,631.2788	87.78
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,393.2121	5,393.2121	5,536.9756	102.67	-	-	-	-	5,393.2121	5,393.2121	5,536.9756	102.67
รายการบุคลากรภาครัฐ	5,393.2121	5,393.2121	5,536.9756	102.67	-	-	-	-	5,393.2121	5,393.2121	5,536.9756	102.67
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	888.4071	1,010.2480	972.1043	96.22	971.4457	1,143.3035	987.0869	86.34	1,859.8528	2,153.5515	1,959.1912	90.97
ผลผลิตการจัดทำงานชลประทาน	888.4071	1,010.2480	972.1043	96.22	971.4457	1,143.3035	987.0869	86.34	1,859.8528	2,153.5515	1,959.1912	90.97
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	140.7191	467.3016	412.1903	88.21	33,478.1803	32,857.8991	28,772.0415	87.57	33,618.8994	33,325.2007	29,184.2317	87.57
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	-	82.1953	76.1143	92.60	11,458.5686	11,082.7830	9,551.1954	86.18	11,458.5686	11,164.9783	9,627.3097	86.23
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	39.8240	35.2115	88.42	2,883.7266	2,903.2943	2,614.3825	90.05	2,883.7266	2,943.1184	2,649.5940	90.03
โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	140.7191	345.2822	300.8645	87.14	19,135.8851	18,871.8217	16,606.4635	88.00	19,276.6042	19,217.1040	16,907.3280	87.98




แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ	ประจำ				ลงทุน				รวม			
	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	202.2812	193.7564	95.79	41,874.7575	41,672.4763	35,757.1238	85.81	41,874.7575	41,874.7575	35,950.8802	85.85
โครงการกักคอกหมา จังหวัด ลำปาง	-	-	-	-	42.7350	42.7350	37.6310	88.06	42.7350	42.7350	37.6310	88.06
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่าง เก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	0.3136	0.0327	10.42	627.7433	624.0985	441.7319	70.78	627.7433	624.4120	441.7646	70.75
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	-	-	833.0773	687.9665	502.5547	73.05	833.0773	687.9665	502.5547	73.05
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	0.6779	0.6124	90.34	144.3615	191.2853	110.7730	57.91	144.3615	191.9631	111.3854	58.02
โครงการห้วยโสมงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ปราจีนบุรี	-	-	-	-	66.8560	139.5274	127.6477	91.49	66.8560	139.5274	127.6477	91.49
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด อุตรดิตถ์	-	-	-	-	192.1459	93.1247	93.1246	100.00	192.1459	93.1247	93.1246	100.00
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัด นครศรีธรรมราช	-	0.5640	0.0350	6.21	1,262.7196	1,367.5117	941.8788	68.88	1,262.7196	1,368.0757	941.9138	68.85



แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ	ประจำ				ลงทุน				รวม			
	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	101.9330	96.8567	95.02	21,203.3308	21,701.1961	18,991.2773	87.51	21,203.3308	21,803.1291	19,088.1339	87.55
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	-	96.8665	94.9583	98.03	8,285.3540	8,106.1591	6,746.8904	83.23	8,285.3540	8,203.0255	6,841.8486	83.41
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	-	-	-	662.7340	595.3738	569.9124	95.72	662.7340	595.3738	569.9124	95.72
โครงการประตูปรับน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	-	-	-	455.2759	462.0031	458.0089	99.14	455.2759	462.0031	458.0089	99.14
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	-	-	-	653.2666	700.8054	565.0125	80.62	653.2666	700.8054	565.0125	80.62
โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	0.3432	0.0191	5.57	3,331.4765	3,111.1248	2,697.3064	86.70	3,331.4765	3,111.4680	2,697.3255	86.69
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	-	356.7000	356.6952	276.7193	77.58	356.7000	356.6952	276.7193	77.58
โครงการประตูปรับน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	-	-	-	101.9156	104.1138	100.6610	96.68	101.9156	104.1138	100.6610	96.68



แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ	ประจำ				ลงทุน				รวม			
	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ หลังโอน เปลี่ยนแปลง
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ชัยภูมิ	-	-	-	-	1,260.7334	1,090.8649	1,039.4040	95.28	1,260.7334	1,090.8649	1,039.4040	95.28
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	-	-	-	556.9372	554.1664	493.5178	89.06	556.9372	554.1664	493.5178	89.06
โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง- น้ำท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	-	-	-	164.5000	183.5649	154.2321	84.02	164.5000	183.5649	154.2321	84.02
โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	-	-	-	-	624.4090	503.9026	362.4759	71.93	624.4090	503.9026	362.4759	71.93
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอก เคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	-	-	185.0000	182.8879	174.7946	95.57	185.0000	182.8879	174.7946	95.57
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพลี จังหวัดระยอง	-	1.3696	1.2423	90.71	673.5604	686.5958	686.1219	99.93	673.5604	687.9654	687.3642	99.91
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก จังหวัด น่าน	-	0.2135	-	-	169.9255	166.7737	166.5542	99.87	169.9255	166.9872	166.5542	99.74
โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำ แม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	-	-	-	-	20.0000	19.9998	18.8935	94.47	20.0000	19.9998	18.8935	94.47





4. ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 4 จำนวน 72,631.2788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 11,614 รายการ (รายการตาม พ.ร.บ. 68 จำนวน 10,787 รายการ และการดำเนินการโอนเงินจัดสรร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) จากงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณที่หมดความจำเป็น จำนวน 827 รายการ) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ซึ่งส่วนใหญ่ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ไม่ผ่านคุณสมบัติ/มีผู้เสนอรายเดียว แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ ได้แก่ ทบทวนราคากลาง แก้ไขแบบรูปรายการ และเผยแพร่ร่าง TOR หรือมีผู้วิจารณ์ และเป็นรายการที่ดำเนินการโอนจัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง) จากงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณที่หมดความจำเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 857 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.38 เนื่องจากส่วนใหญ่ประสบปัญหาอุทกภัย ฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10,523 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.61 และยกเลิก จำนวน 213 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.83 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบประมาณจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบกลาง เป็นต้น (ดังรูปภาพที่ 8)

รูปภาพที่ 8 : แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน



4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมชลประทานได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 แผนงาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมาย (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 : แสดงแผน - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
		แผน	ผล	ร้อยละ
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
- เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,393.2121	5,536.9756	102.67
2. มีแหล่งเก็บกักน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	208,638	175,325	84.03
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	107.40	82.23	77.50
- เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,629.3612	24,440.6730	88.46
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ไร่	436,639	296,113	67.82
- เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,245.3963	11,510.2072	80.80
4. ดำเนินการโครงการพระราชดำริให้ครบทั้งระบบ				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	110	80	72.72
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	22,000	196,515	893.25
- เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,883.7266	2,649.5940	91.88



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
		แผน	ผล	ร้อยละ
5. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รัการะบบนิเวศ)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	27.46	38.22	138.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	967,934	693,948	71.69
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
- เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,595.0256	28,493.8289	87.42



สรุปผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
- พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	208,638	175,325
- ปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	107.40	83.23
- คริวเรือนได้รับประโยชน์	คริวเรือน	2,214,707	1,960,176



4.2 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ได้ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ สำหรับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และข้อกำหนดตามกฎหมายของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล

วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 5,393.2121 ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 5,393.2121 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,536.9756 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.67 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของกรมชลประทานได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100.00	102.67



4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตที่ 1 : การจัดการงานชลประทาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการบริหารจัดการน้ำ



ซ่อมแซมลาดตลิ่งอาคารควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการชลประทาน เชียงใหม่ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่



ก่อสร้างอาคารคั่งน้ำมัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 1,859.8528 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2,153.5515 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,959.1912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.97 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 612 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 583 รายการ และยกเลิก จำนวน 10 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	27.46	38.22
เชิงปริมาณ : สนับสนุนและการจัดการงานชลประทาน	รายการ	560	539

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



4.2.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ **ระยะเวลาดำเนินการ** 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)



ปรับปรุงท่อลอดห้วยแม่แก้ง-RMC.กัวลม พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวลม-กัวคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



โครงการปรับปรุงคลองมะขามเต่า-อุโมง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 11,458.5686 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 11,164.9783 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,627.3097 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.23 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 681 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 138 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 519 รายการ และยกเลิก จำนวน 22 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการซ้ำซ้อน และได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว และติดปัญหาเรื่องที่ดิน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	967,934	693,948
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงงานชลประทาน	รายการ	589	460

ปัญหาและอุปสรรค

1. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข

1. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดการแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ



ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สาย RMC ความยาว 0.250 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยซึ่หิน โครงการชลประทาน สกลนคร ตำบลสร้างคือ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

สถานที่ดำเนินการ พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ ศูนย์ศึกษา และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2,883.7266 ล้านบาท
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2,943.1184 ล้านบาท
เบิกจ่าย จำนวน 2,649.5940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.03 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 777 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน 716 รายการ และยกเลิก จำนวน 3 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	110	80
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	22,000	196,515

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยการบำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)



ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วงกม.2+350 ความยาว 0.315 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ถนนทางเข้า ระยะทาง 1.20 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำลุ่มทุก โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 19,276.6042 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 19,217.1040 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 16,907.3280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.98 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 852.6040 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 792.4775 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 742.7227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.72 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

2. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 4,262.9984 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,167.5347 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,933.0347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.37 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

3. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 14,161.0018 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 14,257.0918 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 12,231.5705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.79 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 8,495 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 212 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8,113 รายการ และยกเลิก จำนวน 161 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว รายการงานซ้ำซ้อน และติดปัญหาเรื่องพื้นที่ เช่น สภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : สนับสนุนและบำรุงรักษางานชลประทาน	รายการ	7,842	7,528
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100

ปัญหาและอุปสรรค

1. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข

1. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



4.2.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการที่ 1 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานโครงการกัวลม - กัวคอกหมา ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม และประมง ในเขตจังหวัดลำปางและช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2569)

สถานที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง

วงเงินตั้งโครงการ จำนวน 3,670.0500 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 42.7350 ล้านบาท
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 42.7350 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 37.6310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 88.00 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 91.86

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	1.00	0.88

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง - แม่จัด - แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ อ่างเก็บน้ำแม่แตง อ่างเก็บน้ำทราย และ อ่างเก็บน้ำดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 15,000.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 627.7433 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 624.4120 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 441.7646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.75 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 18 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 2 **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 76.00 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 72.00

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	4.00	3.04

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนกั้นน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์และบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 340,696 ไร่ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนและปรับปรุงระบบส่งน้ำของพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิม ประมาณ 140,704 ไร่



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2571)

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองนาพงษ์ ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 16,000.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 833.0773

ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 687.9665 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 502.5547 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 14 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 71.60 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 49.54

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	31,155	31,155
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	5.00	3.58

ปัญหาและอุปสรรค มีราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน

แนวทางแก้ไข ออกพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ราษฎรที่ไม่ยอมรับค่าที่ดินสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากไม่พอใจค่าที่ดินที่ได้รับ



โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะกวย จังหวัดชลบุรี

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 9,341.3647 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 144.3615

ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 191.9631 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 111.3854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 76.00 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 95.61

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	2.00	1.52

ปัญหาและอุปสรรค มีราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน

แนวทางแก้ไข ออกพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ราษฎรที่ไม่ยอมรับค่าที่ดินสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากไม่พอใจค่าที่ดินที่ได้รับ



โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

สถานที่ดำเนินการ อำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 9,078.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 66.8560 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 139.5274 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 127.6477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.49 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 101.00 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 98.01

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	1.00	1.01

ปัญหาและอุปสรรค มีราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน

แนวทางแก้ไข ออกพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ราษฎรที่ไม่ยอมรับค่าที่ดินสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากไม่พอใจค่าที่ดินที่ได้รับ



โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค - บริโภค
ของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.
2554

ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุดรธานี

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 4,779.6280 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 192.1459
ล้านบาท ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 93.1247 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 93.1246 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ
ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 100.00 ผลงานภาพรวม ร้อยละ 98.00

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	13,900	13,900
เชิงปริมาณ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	4.00	4.00

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำรวมทั้งสามารถป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอ

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 9,580.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,262.7196 ล้านบาท
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,368.0757 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 941.9138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.85 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 15 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากกรมทางหลวงอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขแบบสะพานรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบต่อโบราณสถานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่กันเขตเพื่อก่อสร้างสะพาน **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 74.46 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 51.67

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	13.00	9.68

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิงสถานที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)



อาคารบังคับน้ำลำห้วยสมทบ ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์



ฝายคลองพอง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 21,203.3308 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 21,803.1291 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 19,088.1339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.55 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 9,655.6715 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9,923.0724 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,018.2633 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.88 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

2. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 417.8050 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 344.8410 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 281.6168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.67 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

3. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 9,316.3120 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9,820.4947 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 8,654.2108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.12 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

4. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 1,813.5423 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,714.7210 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,134.0430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.14 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง



การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 599 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 230 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 360 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการซ้ำซ้อน และได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว และติดปัญหาเรื่องที่ดิน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	163,583	130,270
เชิงปริมาณ : ปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	82.20	58.03
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	277	204

ปัญหาและอุปสรรค

1. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางแก้ไข

1. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

สถานที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)



อาคารบังคับน้ำบ้านทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา



อาคารป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ ระยะที่ 2 (บ้านหนองไม้) ระยะทาง 800 เมตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วงเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 8,285.3540 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 8,203.0255 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,841.8486 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.41 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 279 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 110 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 159 รายการ และยกเลิก จำนวน 7 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว และรายการซ้ำซ้อน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	436,639	296,113
เชิงปริมาณ : งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	217	132



ปัญหาและอุปสรรค

1. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แนวทางแก้ไข

1. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่



โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 63,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทำน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา กลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วงเงินตั้งโครงการ จำนวน จำนวน 5,000.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 662.7340 ล้านบาท

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 595.3738 ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน 569.9124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.72

ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 9 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 85.92 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 58.14

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	13.00	11.17

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



โครงการที่ 11 : โครงการประทุระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ บ้านคกมาต หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 5,000.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 455.2759

ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 462.0031 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 458.0089 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.14 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 98.89 ผลงานภาพรวม ร้อยละ 48.89

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	6.00	6.00
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	9.00	8.90

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาหลุมน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 54,390 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลำน้ำห้วยหลวง และแก้มลิงต่าง ๆ 245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศน์ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี และเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ 284 หมู่บ้าน 37 ตำบล 7 อำเภอ ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 21,000.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 653.2666 ล้านบาท
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 700.8054 ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน 565.0125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.62 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 17 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 86.33 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 20.59

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	3.00	2.59

ปัญหาและอุปสรรค

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

2. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

แนวทางแก้ไข

1. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

2. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย



โครงการที่ 13 : โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ เพื่อผันน้ำเลี้ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะบริเวณจุดแคบสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 25,400.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3,331.4765

ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 3,111.4680 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,697.3255 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.69 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 21 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ **ผลงานปีงบประมาณพ.ศ. 2568** ร้อยละ 77.08 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 58.01

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	13.00	10.02

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 40,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ สำหรับการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทำประมง การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ โครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

สถานที่ดำเนินการ บ้านสะพุงเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 3,100.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 356.7000 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 356.6952 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 276.7193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.58 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 65.39 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 86.90

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	11.00	7.19

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



โครงการที่ 15 : โครงการประจําการระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและบริหารจัดการน้ำในกลุ่มน้ำสงครามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยการก่อสร้างประจําการระบายน้ำแบบขั้นบันได ตามลำน้ำสาขา เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการระบายน้ำเข้า - ออก สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณด้านเหนือน้ำของประจําการระบายน้ำบ้านก่อ



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 1,249.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 101.9156

ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 104.1138 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 100.6610 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.68 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 94.25 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 52.53

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	8.00	7.54

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รองรับแผนพัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชี รวมถึงบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณพื้นที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 6,000.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,260.7334 ล้านบาท งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง จำนวน 1,090.8649 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,039.4040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.28 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหา ที่ดิน **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 82.29 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 55.26

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	21.00	17.28

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 17 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดความเสียหายจากน้ำเอ่อท่วมนาข้าวบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองชัยภูมิ เฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ไร่ และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 18,610 ไร่ ฤดูแล้ง 1,850 ไร่ รวมทั้งคันคลองใช้เป็นทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

สถานที่ดำเนินการ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเล่า ตำบลโพนทอง ตำบลกุดตุ้ม และตำบลบุงคล้า

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 3,440.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 556.9372 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 554.1664 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 493.5178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.06 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 98.59 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 62.69

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	16.00	15.77

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 18 : โครงการประจําการระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำท่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยการก่อสร้างคลองผันน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่หนองหาร โดยน้ำผันลงลำน้ำท่าสามารถลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารได้ ร้อยละ 40 ช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 2,100.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 164.5000 ล้านบาท
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 183.5649 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 154.2321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.02 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 74.50 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 56.98

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	8.00	5.96

ปัญหาและอุปสรรค ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

แนวทางแก้ไข ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย



โครงการที่ 19 : โครงการปรับปรุงคลองยม - บ่าน จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับน้ำได้ รวมถึงเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคและการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลปากมูเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 2,971.8766 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 624.4090 ล้านบาท

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 503.9026 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 362.4759 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.93 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 48.73 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 60.88

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	22.00	10.72

ปัญหาและอุปสรรค มีราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน

แนวทางแก้ไข ออกพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ราษฎรที่ไม่ยอมรับค่าที่ดินสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากไม่พอใจค่าที่ดินที่ได้รับ



โครงการที่ 20 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ 11,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วงเงินตั้งโครงการ จำนวน 1,880.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 185.0000 ล้านบาท

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 182.8879 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 174.7946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.57 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 96.84 ผลงานภาพรวม ร้อยละ 87.40

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ : ปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	19.20	19.20
เชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	10.00	9.68

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 21 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล์ จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎรที่อยู่ในเขตอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

สถานที่ดำเนินการ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 3,561.6200 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 673.5604 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน

687.9654 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 687.3642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 101.74 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 54.31

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	19.00	19.33

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 22 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้การเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มตอนบน และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคของประชาชน ในเขตอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอท่าวังผา ตลอดจนถึงพื้นที่ราบลุ่มริมลำน้ำน่าน

มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566



ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2573)

สถานที่ดำเนินการ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วงเงินตั้งโครงการ จำนวน 6,200.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 169.9255 ล้านบาท
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 166.9872 ล้านบาท
เบิกจ่าย จำนวน 166.5542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.74

ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 4 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ **ผลงาน** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 96.00 ผลงานภาพรวม ร้อยละ 2.88

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	3.00	2.88

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการที่ 23 : โครงการปรับปรุงคลองชักแม่ป้ายมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในคลอง สำหรับการอุปโภค - บริโภค และเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่



มติ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2573)

สถานที่ดำเนินการ อำเภอสวรรคโลก-อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วงเงินทั้งโครงการ จำนวน 3,557.0000 ล้านบาท

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 จำนวน 20.0000 ล้านบาท
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 19.9998 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 18.8935 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.47 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น **ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** ร้อยละ 94.00 **ผลงานภาพรวม** ร้อยละ 0.94

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	1.00	0.94

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี





5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
3. มีราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน
4. เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แนวทางแก้ไขในภาพรวม

1. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ออกพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ราษฎรที่ไม่ยอมรับค่าที่ดิน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากไม่พอใจค่าที่ดินที่ได้รับ
4. ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
5. นำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาในปีต่อ ๆ ไป







6. การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ


Czo'ko/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)				ผลสัมฤทธิ์							
	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)		ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)		ปริมาณเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม	82,746.7218	82,746.7218	72,631.2788	87.78	208,638	175,325	1,415,573	1,001,061	2,214,707	1,960,176	107.40	83.230
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,393.2121	5,393.2121	5,536.9756	102.67	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการบุคลากรภาครัฐ	5,393.2121	5,393.2121	5,536.9756	102.67	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,859.8528	2,153.5515	1,959.1912	90.97	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,859.8528	2,153.5515	1,959.1912	90.97	-	-	27.46 ล้านไร่	38.22 ล้านไร่	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	33,618.8994	33,325.2007	29,184.2317	87.57	-	-	967,934	693,948	2,038,309	1,864,109	-	-
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	11,458.5686	11,164.9783	9,627.3097	86.23	-	-	967,934	693,948	184,127	145,110	-	-
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,883.7266	2,943.1184	2,649.5940	90.03	-	-	-	-	93,844	88,394	-	-
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	19,276.6042	19,217.1040	16,907.3280	87.98	-	-	-	-	1,760,338	1,630,605	-	-




Czo'ko/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)				ผลสัมฤทธิ์							
	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)		ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)		ปริมาณเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	41,874.7575	41,874.7575	35,950.8802	85.85	208,638	175,325	447,639	307,113	176,398	96,067	107.40	83.230
โครงการทิวคอกหมา จังหวัดลำปาง	42.7350	42.7350	37.6310	88.06	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	627.7433	624.4120	441.7646	70.75	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	833.0773	687.9665	502.5547	73.05	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	144.3615	191.9631	111.3854	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	66.8560	139.5274	127.6477	91.49	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	192.1459	93.1247	93.1246	100.00	13,900	13,900	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,262.7196	1,368.0757	941.9138	68.85	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,203.3308	21,803.1291	19,088.1339	87.55	163,583	130,270	-	-	112,390	72,029	82.20	58.030



Czo'ko/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)				ผลสัมฤทธิ์							
	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)		ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)		ปริมาณเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,285.3540	8,203.0255	6,841.8486	83.41	-	-	436,639	296,113	64,008	24,038	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	662.7340	595.3738	569.9124	95.72	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประตุน้ำฝายน้ำครึ่สองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	455.2759	462.0031	458.0089	99.14	-	-	-	-	-	-	6.00	6.00
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	653.2666	700.8054	565.0125	80.62	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,331.4765	3,111.4680	2,697.3255	86.69	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	356.7000	356.6952	276.7193	77.58	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประตุน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	101.9156	104.1138	100.6610	96.68	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	1,260.7334	1,090.8649	1,039.4040	95.28	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	556.9372	554.1664	493.5178	89.06	-	-	-	-	-	-	-	-



Czo'ko/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)				ผลสัมฤทธิ์							
	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 68 (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)		ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)		ปริมาณเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการประจวบคายน้ำลำน้ำพุ้ง-น้ำท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164.5000	183.5649	154.2321	84.02	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	624.4090	503.9026	362.4759	71.93	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	185.0000	182.8879	174.7946	95.57	-	-	11,000	11,000	-	-	19.20	19.20
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	673.5604	687.9654	687.3642	99.91	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิ จังหวัดน่าน	169.9255	166.9872	166.5542	99.74	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่ซ้ายมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย	20.0000	19.9998	18.8935	94.47	-	-	-	-	-	-	-	-





7. สรุปผลการวิเคราะห์

กรมชลประทานได้ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางของรัฐบาลที่สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนปฏิบัติการราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 82,746.7218 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 ผลการใช้จ่าย จำนวน 82,806.5152 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100.07 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 72,631.2788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78 โดยดำเนินงานทั้งสิ้น 27 ผลผลิต/โครงการ สรุปได้ดังนี้

1. ผลผลิต/โครงการที่เบิกจ่ายได้**มากกว่า**ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม (ร้อยละ 87.78) มีจำนวน 16 ผลผลิต/โครงการ ได้แก่

- ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน
- โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
- โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่ข่ายมฝ่งขวา จังหวัดสุโขทัย
- โครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี
- โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
- โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการประตุน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- โครงการประตุน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน
- โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง
- โครงการก๊วกอหมา จังหวัดลำปาง



ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ทำให้โครงการดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณ ได้มากกว่าร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานปีเดียวที่ดำเนินการเอง และวงเงินงบประมาณไม่สูงมากนัก ทำให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เร็ว ส่งผลให้เบิกจ่ายได้สูง หรือเป็นงานผูกพันเดิม ซึ่งมีสัญญาอยู่แล้ว และการเบิกจ่ายตามงวดงาน จึงสามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา/งวดงาน พร้อมทั้งมีการเร่งรัด ปรับแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. ผลผลิต/โครงการที่เบิกจ่ายได้ **น้อยกว่า** ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม มีจำนวน 11 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
- โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
- โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นครศรีธรรมราช
- โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
- โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
- โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์
- โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
- โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้โครงการดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณ ได้น้อยกว่าร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม เนื่องจาก

1. ระเบียบกฎหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
2. การพัฒนาแหล่งน้ำมีผลกระทบหลายด้าน เช่น ราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ดำเนินการ บางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่หรือไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน และสภาพพื้นที่หรือการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหรือเพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ ส่งผลทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา เป็นต้น
3. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
4. ส่วนใหญ่เป็นงานปีเดียวที่เป็นงานจ้างเหมา หรืองานผูกพันใหม่ และวงเงินงบประมาณสูง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการซื้อจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งมีเงื่อนไขและระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญา และต้องสอดคล้องไปกับการดำเนินการก่อสร้าง หรือมีเบิกจ่ายงวดเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ



นอกจากนี้ ตรวจสอบแล้วพบว่า งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายการงานที่ยกเลิก จำนวน 213 รายการ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2568 จำนวน 1,152.3682 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการซ้ำซ้อน และได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของรายการงานที่ยกเลิก ได้แก่ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น จำนวน 1,350 ไร่ ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 16,240 ไร่ ตัวชี้วัด : ปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 1.60 ล้านลูกบาศก์เมตร และตัวชี้วัด : คริวเรือได้รับประโยชน์ 19,596 คริวเรือ) แต่ทั้งนี้ กรมมีการปรับแผนการดำเนินงาน โดยนำงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย หรือยกเลิก มาดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ พบว่า หากมีการแจ้งคืนงบประมาณดังกล่าวเพื่อนำไปดำเนินการ โอนจัดสรร (เปลี่ยนแปลง) ค่าเช่า หรือใกล้สิ้นปีงบประมาณ จะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณลดลง โดยจะทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี ซึ่งจะเป็นการกันแบบมีหนี้ เหมือนมีหนี้ และเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 168 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 195 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568 หรือไม่สามารนำไปดำเนินการโอนจัดสรร (เปลี่ยนแปลง) ได้ทันจึงทำให้ถูกพับ งบประมาณ



ภาคผนวก

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1877/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข ๖๘๗๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและค่าใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคณะอนุกรรมการในแต่ละสายงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบ

ที่ปรึกษา

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ๑. อธิบดีกรมชลประทาน | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา | ที่ปรึกษา |
| ๓. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง | ที่ปรึกษา |
| ๔. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ | ที่ปรึกษา |

คณะกรรมการ

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | กรรมการ |
| ๕. - ๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ | กรรมการ |
| ๒๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ | กรรมการ |
| ๒๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | กรรมการ |
| ๒๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

๒๕. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	กรรมการ
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	กรรมการ
๒๘. ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	กรรมการ
๒๙. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓๐. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรรมการ
๓๑. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	กรรมการ
๓๒. ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๓๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วม	กรรมการ
๓๔. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๓๕. เลขานุการกรม	กรรมการ
๓๖. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๓๗. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๓๘. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๓๙. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๐. ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๒. ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓. ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๔. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- กำหนดมาตรการเร่งรัดต่าง ๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- กำกับ ติดตาม เร่งรัดการก่องหนี่ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามที่กำหนด
- กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรม ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.) เงินกันเหลือมปี งบกลาง เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานและเงินกองทุนจัดรูปที่ดินกลาง
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา

องค์ประกอบ

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | อนุกรรมการ |
| ๓. - ๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ | อนุกรรมการ |
| ๒๐. ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ | อนุกรรมการ |
| และการมีส่วนร่วม | |
| ๒๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (ผชช.อท.๑) | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๒๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (ผชช.อท.๒) | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๓. ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | |
| ๒๔. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ ๑ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กองแผนงาน | |

๒.๒ สายงานก่อสร้าง

องค์ประกอบ

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการ |
| ๖. - ๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง | อนุกรรมการ |
| ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ - ๑๖ | |
| ๒๒. - ๓๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง | อนุกรรมการ |
| ชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖ | |
| ๓๘. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม | อนุกรรมการ |
| สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | |
| ๓๙. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม | อนุกรรมการ |
| กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | |
| ๔๐. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม | อนุกรรมการ |
| สำนักเครื่องจักรกล | |
| ๔๑. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม | อนุกรรมการ |
| สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | |
| ๔๒. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | |
| ๔๓. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | |

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๔๔. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔๖. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ ๑
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔๗. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ ๒
กองแผนงาน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.๓ สายงานบริหาร

องค์ประกอบ

- | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร | อนุกรรมการ |
| ๗. เลขานุการกรม | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนสัญญาพัสดุ กองพัสดุ | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ ๑
กองแผนงาน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.๔ สายงานวิชาการ

องค์ประกอบ

- | | |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ผชช.ผค.๒) | อนุกรรมการและเลขานุการ |

๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ๗. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม
สำนักวิจัยและพัฒนา | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ ๒
กองแผนงาน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

๑. ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสายงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด
 ๒. ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสายงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.) เงินกันเหลือมปี งบกลาง เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
 ๓. รายงานความก้าวหน้าการติดตามงานของสายงานที่รับผิดชอบ ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมชลประทานทราบ โดยกองแผนงานสรุปเสนอกรมต่อไป
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุริยพล นุชอนงค์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน


มนรดา/ร่าง/พิมพ์
๒๕/ทาน/ตรวจ

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๖๕๕๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๘๙๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๘๙๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ นั้น

กรมบัญชีกลางจึงขอแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนนี้) รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒. เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้โดยเร็ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้อนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพันต่อไป

๒.๒.๒ กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่องหน้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๒.๓ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๔ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่องหน้ และการเบิกจ่าย ให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒.๕ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐ ในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ทีอาพร

(นางสาวทีอาพร ผาสุข)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



<https://shorturl.asia/nhJHa>

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๙๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ให้ความเห็นชอบ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔
และการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนนี้) รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๑๐๐
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดให้
เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
โดยเฉพะอย่างยิ่งงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจากสถานการณ์เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย และมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันซึ่งไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔)
และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖
ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๘ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ

สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๓. การพิจารณาผลกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ต่อไป

อนึ่ง ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำหรับเงินงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 รับทราบและเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ



เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้



เงินกันไว้เบิกเหลือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568



รายจ่ายลงทุน

- ✓ รายจ่ายลงทุนปีเดียว ก่อนนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
- ✓ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการใหม่ ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2



ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา

เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568



เป้าหมายการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



หน่วย : ล้านบาท

เดือน/ปี	เป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย					
	ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
ต.ค. 67	12.47	9.10	12.13	11.79	13.14	5.73
พ.ย. 67	24.53	17.90	23.87	23.21	25.86	11.27
ธ.ค. 67 (สิ้นไตรมาส 1)	37.00	27.00	36.00	35.00	39.00	17.00
ม.ค. 68	45.27	35.96	43.58	42.58	48.30	23.20
ก.พ. 68	52.73	44.04	50.42	49.42	56.70	28.80
มี.ค. 68 (สิ้นไตรมาส 2)	61.00	53.00	58.00	57.00	66.00	35.00
เม.ย. 68	67.26	60.25	65.58	64.58	69.63	41.26
พ.ค. 68	73.74	67.75	73.42	72.42	73.37	47.74
มิ.ย. 68 (สิ้นไตรมาส 3)	80.00	75.00	81.00	80.00	77.00	54.00
ก.ค. 68	86.74	81.40	87.40	86.07	84.75	62.72
ส.ค. 68	93.48	87.80	93.80	92.13	92.50	71.52
ก.ย. 68 (สิ้นไตรมาส 4)	100.00	94.00	100.00	98.00	100.00	80.00



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



เป้าหมาย
การเบิกจ่าย
และการใช้จ่าย (%)

	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	36	35	58	57	81	80	100	98
รายจ่ายลงทุน	39	17	66	35	77	54	100	80
รายจ่ายภาพรวม	37	27	61	53	80	75	100	94

รายจ่ายประจำ

รายจ่ายลงทุน

รายจ่ายภาพรวม

แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด
ที่ ทค 0412.4/ว 650
ลง 29 ตุลาคม 2567

SCAN ME



เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเฉพาะรายจ่าย
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ที่อยู่ระหว่างดำเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

1 กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการ
ให้เร่งดำเนินการส่งเงิน**จัดสรร**ไปยัง
สำนักงานในส่วนภูมิภาค**ภายใน 5 วัน**
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

2 กรณี**รายจ่ายลงทุนปีเดียว**ไม่ว่าจะเบิกจ่าย
งบรายจ่ายใดให้**ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ**
ภายในไตรมาสที่ 1 สำหรับรายการผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

3 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวได้ **ภายในไตรมาสที่ 2**

4 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหาร
จัดการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ปัญหา อุปสรรค และคาดการณ์
การก่อหนี้และการเบิกจ่าย **ให้กรมบัญชีกลาง**
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

5 ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแล
ให้หน่วยงานของรัฐในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไป **ใช้ประกอบการพิจารณาในการ**
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ



แนวทางการบริหารงบประมาณและปฏิบัติการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Procurement ๐๒/๒๕๖๗/๒๕๖๗

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๔๗ ภายใน ๒๖๑๒, ๒๔๕๓
ที่ กพด ๓๕๓/๕ /๒๕๖๗ วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และ สถาบัน สำเนา อธช.

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/
ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และสามารถก่องหนผู้กัพั้นและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ทั้งนี้ การที่จะถือว่า
หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อคณะ
อนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐ
และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เร่งรัดการเบิกจ่าย
และใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กองพัสดุจึงขอความร่วมมือความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการในระบบ PMS กรณีใช้จ่ายเงินงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ข้อมูลงบประมาณประจำปี

ฝ่ายวิศวกรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ในระบบ PMS

๑.๒ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กระดาดำทำการ)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ PMS ทุกรายการ

ตามข้อ ๑.๑ แต่ยังมีต้องเสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ

๑.๓ การจัดทำ...

๑.๓ การจัดทำร่างขอบเขตของงานทั้งหมดโครงการ และเอกสารซื้อหรือจ้าง

(๑) หน่วยงานเจ้าของงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำ TOR และเอกสารซื้อหรือจ้าง

(๒) เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ TOR หรือจะเสนอขอความเห็นชอบไปพร้อมกับรายงานขอซื้อหรือจ้างก็ได้

๑.๔ การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(๑) หน่วยงานเจ้าของงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลาง

(๒) เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบราคากลาง

๒. รายการงาน/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมชลประทานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายการงาน/โครงการได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

๒.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑.๑ หน่วยงานเจ้าของงานดำเนินการเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กระดาดำทำการ) ทุกรายการงาน/โครงการ ตามข้อ ๑.๒ เสนอหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงานให้ความเห็นชอบ โดยดำเนินการตามบันทึกกองพัสดุ ต่วนที่สดุ ที่ กพต ๒๑๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒.๑.๒ หน่วยงานพัสดุที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี โดยประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน (ใหม่) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๒.๑.๑ ถึงข้อ ๒.๑.๒ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญา

๒.๒.๑ เมื่อหน่วยงานพัสดุที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๒.๑.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของงานรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

๒.๒.๒ ให้หน่วยงาน...

๒.๒.๒ ให้หน่วยงานกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

๒.๓ การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๒.๓.๑ หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ หน่วยงานต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญา

๒.๓.๒ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้แล้ว ให้กองแผนงานเร่งรัดจัดสรรงบประมาณและสร้างรหัสงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของงานโดยเร็ว และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดในระบบ e-GP และระบบ PMS ให้ถูกต้อง ก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ทั้งนี้ กรมจะติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา จากระบบ PMS จึงขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

รจร.

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
- อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับ
นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑
ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑
หมายความว่า เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๑ วรรคแรก กำหนดว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ”
และข้อ ๑๒ กำหนดว่า “หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ ๑๑ แล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓
หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
ประกอบกับข้อ ๑๓ กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑
วรรคสาม ต่อไป” นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับในกรณีต่างๆ
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๗) กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จะผ่านการพิจารณา
ของรัฐสภา หรือกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีล่วงแล้วไปพลางก่อน ตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณา
งบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน
เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ
จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ กรณีใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. หมายถึง เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒.๒ กรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีน” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ไปพลางก่อน สำหรับวงเงินงบประมาณเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานของรัฐแล้ว ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑

๒.๓ กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หมายถึง หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่หน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๒.๔ กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หมายถึง หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว และหน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ตรวจสอบรายการถูกต้องและมีเงินจัดสรรเพียงพอแล้ว

๒.๕ กรณีเป็นเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยของรัฐ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแล้ว หรือสำนักงบประมาณได้อนุมัติแล้ว แล้วแต่กรณี

๓. ตามข้อ ๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔

๔. ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

๕. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๕.๑ กรณีตามข้อ ๒.๑ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


๕.๒ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานของรัฐเร่งรัดจัดสรรเงินงบประมาณและสร้างรหัสงบประมาณให้หน่วยงานภายในสังกัดโดยเร็ว หากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังไม่ระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ได้ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ให้บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ก่อนลงนามในสัญญา

๕.๓ กรณีตามข้อ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐจะต้องบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของหน่วยงานของรัฐระดับกรมไปพลางก่อน

๖. สำหรับกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ ๔๕๕๓ ๔๕๘๘ และ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๑๔



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรคแรก กำหนดว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ” และข้อ ๑๒ กำหนดว่า “หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี” นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้


๑. กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ใช้จ่ายจากเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายรวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง เป็นต้น การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ แล้ว

๒. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ ๔๕๕๑ ๔๕๕๓ ๔๕๘๘ ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๕๔๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้กรมสามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันมิให้งบประมาณถูกพับ และสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		สิ้นไตรมาสที่ ๑		สิ้นไตรมาสที่ ๒		สิ้นไตรมาสที่ ๓		สิ้นไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒. ให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้โดยเร็ว ดังนี้

๒.๑ กรณีงานปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑) และใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๔)

๒.๒ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) และใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๔)


๓. ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเลิก) แจ้งคืนกองแผนงานโดยเร็ว เพื่อดำเนินการโอนเงินจัดสรรดังกล่าวไปชำระหนี้ตามกฎหมายและใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ต่อไป

๔. กรณี ...

๔. กรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการงานพระราชดำริ งานนโยบาย งานที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ให้จัดส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น (ประมาณการ ชป.๓๒๕ รายการคำนวณแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) มายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ



(นายสุริยพล นุชอนงค์)

รชส. รักษาราชการแทน อธช.

ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กพด. แจ้งการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 68 (กพด. 9594/2567 ลว. 5 ส.ค. 67)

25 ส.ค. 67
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

1 - สงป. อนุมัติ Plan, Cash Flow และ โอนจัดสรรงบประมาณ

2 - กผง. โอนจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

3 - กผง. แจ้งเปิดระบบติดตาม Cen-Project II และให้บันทึกข้อมูลผลความก้าวหน้า (กผง 06/558/2567 ลว. 17 ต.ค. 67)

31 ธ.ค. 67
งานปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จทุกรายการ

เป้าเบิกจ่าย ภาพรวม
ประจำ 35%
27% ลงทุน 17%

เป้าใช้จ่าย ภาพรวม
ประจำ 36%
37% ลงทุน 39%

31 มี.ค. 68
งานผูกพันใหม่ ก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จ

เป้าเบิกจ่าย ภาพรวม
ประจำ 57%
53% ลงทุน 35%

เป้าใช้จ่าย ภาพรวม
ประจำ 58%
61% ลงทุน 66%

เป้าเบิกจ่าย ภาพรวม
ประจำ 98%
94% ลงทุน 80%

เป้าใช้จ่าย ภาพรวม
ประจำ 100%
100% ลงทุน 100%



6 ก.ย. 67
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

30 ก.ย. 67
- ประกาศใช้ พ.ร.บ. 68

กผง. แจ้งแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายและ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

กผง. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

31 ม.ค. 68
- ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเหลือจ่ายปี 68

เป้าเบิกจ่าย ภาพรวม
ประจำ 80%
75% ลงทุน 54%

เป้าใช้จ่าย ภาพรวม
ประจำ 81%
80% ลงทุน 77%



Finished



แนวทางการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๖๖ ที่ นร.0505/23902 ลว. 25 ตุลาคม 2567

แจ้งแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- 1 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม ร้อยละ 94.00 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 98.00
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80.00 และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม รายจ่ายประจำ
และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100.00
- 2 ให้นำหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค
ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
- 3 **รายการปีเดียว** ให้นำหน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน ธ.ค. 67 (ไตรมาส 1)
- 4 **รายการผูกพันใหม่** ให้นำหน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน มี.ค. 68 (ไตรมาส 2)



กรมชลประทาน



1

กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67



2

งานปีเดียว ให้ก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 67 (ไตรมาส 1)
และใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือน ก.ย. 68 (ไตรมาส 4)



3

งานผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้ก่องหนผู้กผันแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มี.ค. 68 (ไตรมาส 2) และใช้จ่ายงบประมาณให้ทัน
ภายในเดือน ก.ย. 68 (ไตรมาส 4)



4

ให้นำหน่วยงานตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็นหรือยกเลิก
แจ้งคืนกองแผนงานโดยเร็ว เพื่อดำเนินการโอนเงินจัดสรรดังกล่าวไปชำระหนี้
ตามกฎหมาย และใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ต่อไป



5

กรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุน งบประมาณเหลือจ่าย
เพื่อดำเนินการงานพระราชดำริ งานนโยบาย งานที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้นให้จัดส่ง
เอกสารประมาณการ ขป. 325 รายการคำนวณแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น **มายังกองแผนงานในวันที่ 31 ม.ค. 68**



ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
มาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๙๖๒

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๑๐๖๒๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๓๖๒๒
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๓
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๑๓๕
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ว่า

- รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ
- ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นรุตม์ ธีรวงษ์

(นาย นรุตม์ ธีรวงษ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรค), ๑๕๓๒ (ปัญหารีย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๗/๒๕๖๗



กวค.144.....

วันที่ 24 ก.ย. ๖๗

เวลา 15.4๐

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. การปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๗ รายกระทรวง
 ๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
 ๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ๔. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง
 ๕. แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายหน่วยงานเจ้าของโครงการ
 ๖. แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายโครงการ
 ๗. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งมีการทบทวนองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ ติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

คณะกรรมการฯ เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อรายงาน
ผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จนถึงวันที่

/๑๓ กันยายน...

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง (บก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สรุปได้ ดังนี้

๓.๑.๑ บก. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) รวบรวม และจัดทำรายงานการคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ของกระทรวงที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๒๑.๐๐) จำนวน ๑๐ กระทรวง ๓๘ หน่วยงาน เสนอประธานคณะกรรมการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ มอบหมาย โดยมีการคาดการณ์การก่อหนี้และเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๒๐ และ ๖๖.๖๕ ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายก่อหนี้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๐๐) เนื่องจากมีการก่อหนี้ล่าช้า ทำให้รายการส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณและจะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒) แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ โดยให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งรัดการตรวจรับงานสำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้แจ้งสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดที่ดูแลหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ด้วยแล้ว

๒.๒) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๐ กระทรวง และหน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๗ หน่วยงาน ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

๓) แจ้งเวียนหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ ไม่กำหนดวงเงิน โดยให้หน่วยงานของรัฐเลือก (List) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ New GFMS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องถูกพับไป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

/๔) แจ้งเวียน...

๔) แจ้งเวียนหนังสือข้อมความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน เมื่อทราบยอดเงิน (ก่อนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในวาระที่ ๒) โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนักงบประมาณแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓.๑.๒ สคร. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สคร. ได้มีหนังสือแจ้งข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๑.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ รัฐวิสาหกิจที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำกว่าอัตราการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มปีบัญชี

๑.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแล ของแต่ละกระทรวงร่วมกันพิจารณาปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ (วงเงินเบิกจ่ายลงทุน) โดยให้ กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจได้รายงานผล การพิจารณาปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ (วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน) ต่อ สคร. โดยรัฐวิสาหกิจ มีการปรับเพิ่มกรอบงบลงทุน รวมจำนวน ๑๒,๒๙๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ สคร. ได้จัดให้มีการประชุมติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ร่วมกับ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๙ แห่ง ที่มีแนวโน้มว่าจะเบิกจ่าย งบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เพื่อประเมิน สถานการณ์ สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบลงทุน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง เြงรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของแต่ละรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๑.๓ สบน. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ติดตามผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ซึ่งอยู่ ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) เป็นรายเดือนและรายงานผลการติดตามโครงการ ต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณน.) โดยในคราวประชุม คณน. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบแล้ว

๒) แจ้งผลการติดตามโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ถึงผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อกำกับดูแล รวมถึง เြงรัดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานแผนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด โดยได้แจ้งผลการติดตามโครงการดังกล่าว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ เพื่อใช้ประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดหาเงินกู้รายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณรวม ๓,๘๗๕,๙๘๙.๐๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๔๓๙,๔๓๓.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๔ ประกอบด้วย

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วงเงินงบประมาณ ๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓,๒๗๒,๕๘๘.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๕.๙๖ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๐๙๗,๘๑๔.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๓.๙๘ (เป้าหมายร้อยละ ๙๓.๐๐) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๘,๗๕๐.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒,๗๒๕,๒๒๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑.๒๒ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๐๘,๗๗๘.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๐.๑๙ (เป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณ ๗๒๑,๒๔๙.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๕๔๗,๓๖๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒๔.๑๑ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๙,๐๓๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒๑.๐๖ (เป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐)

๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๑๕๘,๕๓๓.๔๓ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๕๖,๘๖๘.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๐,๓๙๙.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๕

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๓๗,๔๕๕.๖๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๑,๒๑๙.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๕ โดยผลการเบิกจ่ายข้างต้นมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ ^{๑)}	เบิกจ่าย	สูงต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	
				ก่อนนี้	เบิกจ่าย
๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๗๒,๕๘๘.๘๒ (ร้อยละ ๙๔.๐๔)	๓,๐๙๗,๘๑๔.๐๐ (ร้อยละ ๘๙.๐๒)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๕.๙๖	๙๓.๐๐ ▼ -๓.๙๘
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๗๕๘,๗๕๐.๕๐	๒,๗๒๕,๒๒๒.๙๗ (ร้อยละ ๙๘.๗๘)	๒,๗๐๘,๗๗๘.๑๘ (ร้อยละ ๙๘.๑๙)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๑.๒๒	๙๘.๐๐ ▲ ๐.๑๙
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๗๒๑,๒๔๙.๕๐	๕๔๗,๓๖๕.๘๕ (ร้อยละ ๗๕.๘๙)	๓๘๙,๐๓๕.๘๒ (ร้อยละ ๕๓.๙๔)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๒๔.๑๑	๗๕.๐๐ ▼ -๒๑.๐๖
รายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบกลาง	๖๕๙,๒๙๖.๑๖	๕๔๓,๔๗๔.๖๖ (ร้อยละ ๘๒.๔๓)	๓๘๗,๖๓๙.๑๑ (ร้อยละ ๕๘.๘๐)	๑๐๐.๐๐ ▼ -๑๗.๕๗	๗๕.๐๐ ▼ -๑๖.๒๐
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑๕๘,๕๓๓.๔๓	๑๕๖,๘๖๘.๙๐ (ร้อยละ ๙๘.๙๕)	๑๓๐,๓๙๙.๘๕ (ร้อยละ ๘๒.๒๕)		
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^{๒)}	๒๓๗,๔๕๕.๖๔		๒๑๑,๒๑๙.๙๕ (ร้อยละ ๘๘.๙๕)		
รวมทั้งสิ้น	๓,๘๗๕,๙๘๙.๐๗		๓,๔๓๙,๔๓๓.๘๐ (ร้อยละ ๘๘.๗๔)		

หมายเหตุ : ^{๑)} ก่อนนี้ หมายถึง ลงนามในสัญญาแล้ว และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

^{๒)} ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ บก. ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และ สคร. ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้รวม
จำนวน ๙๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

จำนวน โครงการ	วงเงินลงทุน สะสมตาม มติคณะรัฐมนตรี	ผลการเบิกจ่าย สะสม (ณ ส.ค. ๖๗)	ร้อยละผล เบิกจ่ายสะสม เทียบกับวงเงิน ลงทุน	แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ส.ค. ๖๗)	ร้อยละผล เบิกจ่าย เทียบแผนฯ
๙๕	๒,๐๓๔,๑๑๕	๑,๐๖๔,๗๙๕	๕๒	๑๑๗,๒๕๗	๑๑๐,๓๘๕	๙๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) ผลเบิกจ่ายรายกระทรวง จำแนกตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และประเภทหน่วยงาน แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน
๕ กระทรวง วงเงินรวม ๒,๙๙๓.๕๖ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๑,๙๖๔.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒
เบิกจ่ายแล้ว ๗๗๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๖ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๓.๖๘ ๒๑.๘๒ และ ๒๙.๓๕
ตามลำดับ

/๑.๒) กระทรวง...

๑.๒) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๖ กระทรวง วงเงินรวม ๒๓,๐๖๖.๔๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๙,๐๓๔.๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๕๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๘๒๖.๖๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๒๘ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๘.๕๘ ๔๓.๗๙ และ ๕๔.๔๖ ตามลำดับ

๑.๓) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๗ กระทรวง วงเงินรวม ๒๐๗,๖๘๕.๓๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๑๗๑,๕๑๐.๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๘,๔๗๘.๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๐๕ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๙.๖๑ ๔๔.๖๘ และ ๕๕.๖๗ ตามลำดับ

๑.๔) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๒ กระทรวง วงเงินรวม ๓๐๑,๒๒๔.๗๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๔๕,๑๘๖.๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๔๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๗,๕๔๗.๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๖๒ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๙.๔๗ และ ๖๐.๓๒ ตามลำดับ

๑.๕) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ งบกลาง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงานของรัฐสภา ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี สภากาชาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานของศาล หน่วยงานอื่นของรัฐ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน วงเงินรวม ๑๘๖,๒๗๙.๓๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๑๐๙,๖๖๙.๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๘๗ เบิกจ่ายแล้ว ๘๗,๔๐๕.๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๖.๙๒ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ งบกลาง หน่วยงานของรัฐสภา และจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒.๒๕ ๑๕.๔๖ และ ๑๗.๕๕ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๓ ดังนี้

ตารางที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำแนกตามวงเงินงบประมาณและประเภทหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเภทหน่วยงาน	จำนวน กระทรวง/ หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ			ก่อหนี้		เบิกจ่าย		เปรียบเทียบเป้าหมาย	
			จำนวน โครงการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ก่อหนี้ ร้อยละ ๑๐๐	เบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕
๑	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท	๕	๒,๙๕๙	๒,๙๓๓.๕๖	๐.๕๓	๑,๙๖๔.๔๕	๖๕.๖๒	๓๐๖.๒๕	๒๕.๙๖	-๓๔.๓๘	-๔๙.๐๔
๒	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท	๖	๒,๔๖๘	๒๓,๐๖๖.๔๑	๙.๓๙	๙๓,๐๓๔.๘๒	๘๒.๕๒	๑๔,๘๒๖.๖๗	๖๔.๒๘	-๓๗.๕๘	-๕๐.๗๒
๓	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท	๗	๓๒,๙๓๖	๒๐๗,๖๘๕.๓๙	๒๘.๗๐	๑๗๑,๕๑๐.๓๙	๘๒.๕๘	๑๑๘,๔๗๘.๖๔	๕๗.๐๕	-๓๗.๕๒	-๕๗.๙๕
๔	กระทรวงที่มีรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๒	๓๑,๒๒๕	๓๐๑,๒๒๔.๗๘	๔๑.๖๖	๒๔๕,๑๘๖.๙๕	๗๘.๕๐	๑๖๗,๕๔๗.๒๗	๕๕.๖๒	-๑๘.๖๐	-๓๙.๓๘
๕	หน่วยงานอื่นๆ	๑๑	๒๐,๓๐๒	๑๘๖,๒๗๙.๓๖	๒๕.๘๓	๑๐๙,๖๖๙.๒๔	๕๘.๘๗	๘๗,๔๐๕.๙๙	๔๖.๙๒	-๔๑.๓๓	-๒๘.๐๘
	รวมทั้งสิ้น	๓๑	๕๙,๔๕๖	๗๒๑,๒๙๙.๕๐	๑๐๐.๐๐	๕๙๗,๓๖๕.๘๕	๗๕.๘๙	๓๘๙,๐๓๕.๘๒	๕๓.๙๔	-๒๕.๑๑	-๒๑.๐๖

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒) รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ให้ บก. ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย บก. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) สถานะการดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานรายงาน สถานะการดำเนินงานมีวงเงินเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๕๕.๘๖ ล้านบาท (๓๙๓,๕๓๘.๐๘ - ๓๙๑,๘๘๒.๒๒) คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ และมีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาจากสัดส่วนของสถานะการดำเนินงาน จะเห็นว่า ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๑๑๕.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมาเป็น หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จำนวน ๖๖๒.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗ และลงนามสัญญา มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๘,๘๖๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๔ ความคืบหน้าในการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	กรกฎาคม ๒๕๖๗			สิงหาคม ๒๕๖๗			การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวนโครงการ (๑)	จำนวนเงิน (๒)	ร้อยละ (๓)	จำนวนโครงการ (๔)	จำนวนเงิน (๕)	ร้อยละ (๖)	จำนวนเงิน (๗) = (๕) - (๒)	ร้อยละ (๘) = (๗)/(๒) x ๑๐๐
๑. จัดทำร่าง TOR	๒,๑๓๓	๑๑,๓๕๕.๐๔	๒.๙๐	๒,๒๔๑	๑๕,๔๗๐.๗๖	๓.๙๓	๔,๑๑๕.๗๒	๓๖.๒๕
๒. หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	๙๖๘	๖,๒๖๗.๘๙	๑.๖๐	๖๒๔	๖,๙๓๐.๓๙	๑.๗๖	๖๖๒.๕๐	๑๐.๕๗
๓. ประกาศเชิญชวน/เชิญชวน	๓,๘๒๖	๓๒,๒๑๙.๑๑	๘.๒๒	๒,๖๒๘	๒๕,๒๐๖.๓๗	๖.๔๑	-๗,๐๑๒.๗๔	-๒๑.๗๗
๔. หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	๖,๘๙๒	๕๕,๓๒๐.๐๘	๑๕.๑๒	๖,๒๐๙	๔๐,๓๓๕.๖๑	๑๐.๒๕	๑๔,๙๘๔.๔๗	-๒๗.๐๙
๕. ลงนามสัญญา	๖๑,๒๖๑	๒๘๖,๗๓๐.๑๐	๗๓.๑๖	๘๗,๕๖๗	๓๐๕,๕๙๔.๙๕	๗๗.๖๕	๑๘,๘๖๔.๘๕	๖.๕๘
รวม	๗๕,๐๘๐	๓๙๑,๘๘๒.๒๒	๑๐๐.๐๐	๙๙,๖๖๙	๓๙๓,๕๓๘.๐๘	๑๐๐.๐๐	๑,๖๕๕.๘๖	๐.๔๒

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากรายงานการติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๒) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรคมีวงเงินลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๖๙๓.๕๑ ล้านบาท (๑๔,๒๕๓.๗๒ - ๒๑,๙๔๗.๒๓) โดยพิจารณาสัดส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแบบรูปรายการ/รายละเอียด/คุณลักษณะ อยู่ที่ร้อยละ ๓๒.๔๙ ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๖.๙๐ เนื่องจากมีการทบทวนราคากลาง และเผยแพร่ร่าง TOR แล้วมีผู้วิจารณ์ลดลง ร้อยละ ๘.๒๐ และ ๐.๓๕ ตามลำดับ รองลงมาเป็น อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา อยู่ที่ร้อยละ ๒๒.๔๗

/เพิ่มขึ้นจาก...

เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๐.๔๒ และได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน/ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๔๕ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๕.๕๙ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๕ ดังนี้

**ตารางที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗**

หน่วย : ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค	กรกฎาคม ๒๕๖๗			สิงหาคม ๒๕๖๗			เพิ่มขึ้น (+)/ลดลง (-) (๗) = (๖) - (๓)
	จำนวนโครงการ (๑)	จำนวนเงิน (๒)	ร้อยละ (๓)	จำนวนโครงการ (๔)	จำนวนเงิน (๕)	ร้อยละ (๖)	
๑. ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน/ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ	๒๙๗	๓,๔๘๐.๗๖	๑๕.๘๖	๖๓๗	๓,๐๕๗.๓๓	๒๑.๔๕	๕.๕๙
๒. การจัดทำแบบบูรณาการ/รายละเอียด/คุณลักษณะ	๗๕๓	๘,๖๔๖.๘๙	๓๙.๓๙	๖๓๗	๔,๖๓๐.๙๐	๓๒.๔๙	-๖.๙๐
๒.๑ ทบหวนราคากลาง	๒๒๓	๒,๗๙๙.๑๘	๑๒.๗๕	๑๕๕	๖๔๙.๗๙	๔.๕๖	-๘.๒๐
๒.๒ แก้ไขแบบบูรณาการ	๒๐๒	๓,๑๖๕.๓๐	๑๔.๕๒	๒๕๗	๒,๓๔๕.๗๖	๑๖.๔๖	๒.๐๓
๒.๓ เผยแพร่ร่าง TOR แล้วมีผู้วิจารณ์	๓๒๘	๒,๖๘๒.๔๑	๑๒.๒๒	๒๒๕	๑,๖๓๕.๓๕	๑๑.๔๗	-๐.๗๕
๓. เปลี่ยนแปลงพื้นที่/อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่	๔๙	๑,๕๒๓.๓๔	๖.๔๙	๙๘	๓๓๑.๑๖	๒.๓๒	-๔.๑๖
๔. ประกาศเชิญชวน/เชิญชวน	๓๖๖	๒,๓๔๙.๕๓	๑๐.๗๑	๓๙๑	๑,๕๒๕.๓๔	๑๐.๗๐	-๐.๐๑
๔.๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	๑๓๖	๕๖๙.๓๔	๒.๕๙	๑๘๕	๔๗๘.๑๙	๓.๓๕	๐.๗๖
๔.๒ ไม่ผ่านคุณสมบัติ	๑๔๕	๑,๑๕๓.๓๗	๕.๒๖	๑๑๖	๗๑๘.๗๑	๕.๐๔	-๐.๒๑
๔.๓ มีผู้เสนอรายเดียว	๘๕	๖๒๖.๘๒	๒.๘๖	๙๐	๓๒๘.๒๔	๒.๓๐	-๐.๕๕
๕. ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง	๑๖๕	๑,๒๐๗.๗๑	๕.๕๐	๓๓๔	๑,๕๐๖.๖๘	๑๐.๕๗	๕.๐๗
๕.๑ อุตธรรม	๑๖๕	๑,๒๐๗.๗๑	๕.๕๐	๓๓๔	๑,๕๐๖.๖๘	๑๐.๕๗	๕.๐๗
๕.๒ อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
๖. อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณา	๑๖๗	๔,๘๘๙.๐๐	๒๒.๐๕	๒๔๔	๓,๒๐๒.๓๑	๒๒.๔๗	๐.๔๒
๖.๑ ความเหมาะสมราคา	๑๒๕	๔,๐๑๔.๒๖	๑๘.๒๙	๑๗๙	๒,๗๗๐.๓๒	๑๙.๔๔	๑.๑๕
๖.๒ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด	๔๒	๘๗๔.๗๔	๓.๗๖	๖๕	๔๓๑.๙๙	๓.๐๓	-๐.๗๓
๖.๓ อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑,๗๙๗	๒๑,๙๙๗.๒๓	๑๐๐.๐๐	๒,๓๔๑	๑๔,๒๕๓.๗๒	๑๐๐.๐๐	

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากรายงานการติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๓) การคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่าย

๒.๓.๑) การคาดการณ์การก่อหนี้ของเดือนสิงหาคม จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๕๗๓,๓๙๓.๖๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๕ ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ ทั้งนี้ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๒๐.๕๕ (เป้าหมายการก่อหนี้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

๒.๓.๒) การคาดการณ์การเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๘๕,๔๐๕.๓๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๖ ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ ทั้งนี้ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๓.๒๔ (เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๐๐)

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๖

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ การคาดการณ์การก่อหนี้และการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การก่อหนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ ๗๙.๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๒๐.๒๕ และการเบิกจ่าย จะอยู่ที่ร้อยละ ๖๗.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๗.๕๘ (วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๗๒๑,๒๔๙.๕๐ ล้านบาท)

ตารางที่ ๖ คาดการณ์การดำเนินการก่อหนี้และการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

คาดการณ์การดำเนินการ	เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ) (๑)	กรกฎาคม ๒๕๖๗		สิงหาคม ๒๕๖๗		ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (๖) = [(๕) - (๓)] / (๓) x ๑๐๐	เปรียบเทียบเป้าหมายสูง (+) / ต่ำกว่า (-) (๗) = (๕) - (๑)
		จำนวนเงิน (๒)	ร้อยละ (๓)	จำนวนเงิน (๔)	ร้อยละ (๕)		
การก่อหนี้	๑๐๐.๐๐	๖๐๖,๓๖๘.๙๓	๘๓.๙๒	๕๗๓,๓๙๓.๖๘	๗๙.๔๕	-๕.๓๓	-๒๐.๕๕
การเบิกจ่าย	๗๕.๐๐	๕๐๕,๑๓๓.๕๕	๖๙.๙๑	๔๘๕,๔๐๕.๓๙	๖๗.๒๖	-๓.๗๙	-๗.๗๔

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากรายงานการติดตามความคืบหน้างบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗

รัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖๘,๑๒๔ ล้านบาท โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละรัฐวิสาหกิจจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมจำนวน ๑๙๒,๒๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๗๒ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็น

๑.๑) รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๙๗,๙๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๑ ของกรอบงบลงทุน

๑.๒) รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๙๔,๒๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๖๔ ของกรอบงบลงทุน

๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปี ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุดหรือมีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๑๙ แห่ง (มีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด) โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

๒.๑.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๒,๙๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๙๔ ของกรอบงบลงทุน

/(๒) การรถไฟ...

(๒) การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๐,๔๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๙๗ ของกรอบงบลงทุน

(๓) การประปานครหลวง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๔,๔๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๙๒ ของกรอบงบลงทุน

๒.๑.๒) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๘๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕๔ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๔๖๖ ล้านบาท

(๒) การประปาส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔,๒๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๔๑ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๗๔ ล้านบาท

(๓) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘,๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๑ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๗๗ ล้านบาท

๒.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

๒.๒.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๒,๒๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓๗ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๗๐ ของกรอบงบลงทุน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟผ. สูงกว่าแผนค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเบิกจ่ายเงินลงทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ ๒) บ้านหนองแพบ ซึ่งตามแผนเดิมจะมีการเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๔,๓๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕๘ ของกรอบงบลงทุน

(๓) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๒,๖๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๖๗ ของกรอบงบลงทุน

๒.๒.๒) ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย

๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกกระทรวง

ในปี ๒๕๖๗ กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๘ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ได้แก่

๓.๑) กระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง โดยมีกรอบงบลงทุนรวมจำนวน ๘๘,๖๗๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓,๐๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๕๗ ของกรอบงบลงทุน

๓.๒) กระทรวงคมนาคม กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๙ แห่ง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน ๘๓,๓๓๒ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๒,๑๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๘๔ ของกรอบงบประมาณ

๓.๓) กระทรวงพลังงาน กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน ๖๔,๙๘๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๔,๘๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙ ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๔๖ ของกรอบงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔) การดำเนินการของ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สคร. จะมีหนังสือแจ้งกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๔.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน กำกับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถลงนามในสัญญาโดยเร็ว

๔.๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๖๗ รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายดังกล่าว กำหนดแผนงานให้ชัดเจน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓.๒.๔ การเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

๑) การติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Project) ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาลงงาน สาขาระบบ และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๕ โครงการ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ จำนวน ๑๘ แห่ง ประกอบด้วย ส่วนราชการ ๕ แห่ง และรัฐวิสาหกิจ ๑๓ แห่ง กรอบวงเงินลงทุนสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๐๓๔,๑๑๕ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๐๖๔,๗๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของกรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๗,๒๕๗ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๐,๓๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของแผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓) แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๕,๗๙๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๐,๓๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔ ของแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ดังนี้

๓.๑) รายหน่วยงานเจ้าของโครงการ จำนวนรวม ๑๘ แห่ง มีแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ แห่ง หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ รพท. จำนวน ๓๐,๒๖๓ ล้านบาท รพม. จำนวน ๑๙,๓๐๓ ล้านบาท

กฟผ. จำนวน ๑๗,๘๐๒ ล้านบาท กฟภ. จำนวน ๑๗,๕๕๙ ล้านบาท และการไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๖,๖๔๘ ล้านบาท โดยมีหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒ แห่ง ได้แก่ กองทัพอากาศ (ทร.) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ไม่มีผลเบิกจ่ายตามแผน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓.๒) รายโครงการ จำนวนรวม ๙๕ โครงการ จำแนกตามวงเงินแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๓.๒.๑) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ ของ กฟภ. ๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของ รฟม. และ ๓) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของ รฟท. มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๔๓,๙๓๒ ล้านบาท และไม่มีโครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๒.๒) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๒ โครงการ แผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๔๒ ล้านบาท โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ โดยมีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒) ของ ทร. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ กฟภ. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของ ทอท. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ของ รฟท. และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ของ รฟท. เป็นต้น

๓.๒.๓) โครงการที่มีแผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๗๐ โครงการ แผนเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๔ ล้านบาท โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ โดยมีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น โครงการจัดการถักรวมมะพร้าว จำนวน ๕๐ คัน ของ รฟท. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่-สงขลา อำเภอหาดใหญ่-เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จ.ปทุมธานี ของ กปภ. โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘-๙ ของ กฟผ. และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔ ของ กฟภ. เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๔) คณะกรรมการฯ รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ดังนี้

๔.๑) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ: ควรเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการทั้งในกระบวนการจัดหาที่ดิน การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ และการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาผู้บุกรุก และควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เร่งแก้ไขปัญหาจากข้อพิพาทกับผู้รับจ้าง และเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อจัดหาแรงงานทดแทนให้เพียงพอ

/๔.๒) สบน...

๔.๒) สบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ มีแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้

๔.๒.๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการประจำปีงบประมาณเสนอต่อ สบ. เพื่อนำเสนอ คนน. เห็นชอบ และรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขพร้อมผลการเบิกจ่ายรายเดือนผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment Project Management: IIPM) ภายใต้ระบบ PDMO Portal ของ สบ. เพื่อนำเสนอ คนน. รับทราบ

๔.๒.๒) จัดส่งผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๔.๒.๓) จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่าย และสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ เพื่อประกอบการพิจารณาแผนการจัดหาเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจรายไตรมาส

๔.๒.๔) ติดตามสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๓.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๓	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่องหน้าผูกพันได้โดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่องหน้าผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่องหน้าและเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๒) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพันต่อไป

๒.๓) กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่องหน้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๔) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๕) ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่องหน้และการเบิกจ่ายให้ บก. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๖) ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

๓.๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณา กำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๓) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงนามในสัญญาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ทั้งนี้ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมีความประสงค์จะปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๘ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๕) ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

๖) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑) - ๔) อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๖๗

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จะทำให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะทำให้เม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่เศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อมูลหมายเหตุและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เป็นเรื่อง किคณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี


๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

๘.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

๘.๒ มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวิชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร ๐ ๒๒๗๘ ๗๘๗๘ ต่อ ๔๐๗๑๑ (ขลิ้นธร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fppd@pdmo.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๕๙๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/วส๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้รายงานสถานะการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยกรมมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕๕๗ รายการ งบประมาณ จำนวน ๗,๘๔๔.๑๑๙๒ ล้านบาท และขอให้กรมเร่งรัดดำเนินการรายการที่มีความล่าช้าให้สามารถก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กักไว้เบิกเหลือมปี ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การอุปโภคและการลงทุนภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น นั้น

กองแผนงาน จึงขอให้หน่วยงานของท่านเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ทุกรายการ
๒. เบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กักไว้เบิกเหลือมปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

ด่วนที่สุด

ต้นฉบับ

กองแผนงาน ส่วนบริหารทั่วไป
เลขรับ 4094
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๗.๓๓ น.

เลขที่เอกสารในระบบ E นร0717.1/ว84

ส่วนบริหารทั่วไป (สกก.รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป3861

วันที่ 14 มี.ค. 2568

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน ผอ.พง.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	ภายในสิ้นเดือน
	มีนาคม 2568
	หมายเหตุ

[Handwritten signature]

สิทธิพงษ์
[Handwritten signature]

(นายประกรรชิน ปาลพันธ์)
ผบ.ล.ก. ปฏิบัติราชการแทน สก.

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.พง.

- เพื่อทราบ.....
- เพื่อพิจารณา.....
- เพื่อดำเนินการ.....

เรียน ๑๗.๑๓๖. / ๗๖๕๖๓

- เพื่อทราบ
- เพื่อดำเนินการ

[Handwritten signature]
(นายโรจน์วัฒน์ อิมทรงรุ่ง)

ผอ.พง.
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

[Handwritten signature]
(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.พง.
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๘๔



กรมชลประทาน
เลขรับ ๗๗ 3861
วันที่ 14/03/2568
เวลา.....

สำนักงานประมง

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายบงลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมง ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๗๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสถานะการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยรับงบประมาณ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมงได้แจ้งเวียนให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไม่รวมงบกลาง) และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีข้อสั่งการให้หน่วยรับงบประมาณที่มีรายจ่ายลงทุนเร่งรัดการดำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว โดยรวมถึงรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน พบว่ามีหน่วยรับงบประมาณที่มีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือยังไม่เริ่มดำเนินการและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การอุปโภคและการลงทุนภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินโครงการ/รายการที่มีความล่าช้าให้สามารถก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ สำหรับรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลสถานะ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสถานะการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



ข้อมูลสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘
และข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของหน่วยรับงบประมาณ

สถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไม่รวมงบกลาง)

จำแนกตามกระทรวง/ หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม.
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	102,648	721,468.0833	76,321	483,057.8503	66.95	26,327	238,410.2330	33.05	9.26
สำนักนายกรัฐมนตรี	805	10,699.7263	558	4,338.7988	40.55	247	6,360.9275	59.45	40.55
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	25	111.8049	19	65.7104	58.77	6	46.0945	41.23	58.77
รายการปีเดียว	23	107.7153	17	61.6208	57.21	6	46.0945	42.79	57.21
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	2	4.0896	2	4.0896	100.00			-	100.00
กรมประชาสัมพันธ์	54	553.5676	33	112.4794	20.32	21	441.0882	79.68	20.32
รายการปีเดียว	40	441.7286	20	16.6404	3.77	20	425.0882	96.23	3.77
รายการผูกพันเดิม	2	30.7991	1	14.7991	48.05	1	16.0000	51.95	48.05
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	12	81.0399	12	81.0399	100.00			-	100.00
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค	9	55.9023	3	13.4658	24.09	6	42.4365	75.91	24.09
รายการปีเดียว	7	42.5672	1	0.1307	0.31	6	42.4365	99.69	0.31
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	2	13.3351	2	13.3351	100.00			-	100.00
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	64	4,127.7027	37	780.8613	18.92	27	3,346.8414	81.08	18.92
รายการปีเดียว	50	260.0095	26	65.4031	25.15	24	194.6064	74.85	25.15
รายการผูกพันใหม่	2	3,101.9400			-	2	3,101.9400	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	5	742.9575	4	692.6625	93.23	1	50.2950	6.77	93.23
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	7	22.7957	7	22.7957	100.00			-	100.00
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	16	472.4217	6	26.0648	5.52	10	446.3569	94.48	5.52
รายการปีเดียว	9	417.1681	1	3.0336	0.73	8	414.1345	99.27	0.73
รายการผูกพันเดิม	2	32.2224			-	2	32.2224	100.00	-
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	5	23.0312	5	23.0312	100.00			-	100.00
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	39	165.0800	5	2.9394	1.78	34	162.1406	98.22	1.78
รายการปีเดียว	34	136.0201	5	2.9394	2.16	29	133.0807	97.84	2.16
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	5	29.0599			-	5	29.0599	100.00	-
สำนักงบประมาณ	37	540.4878	17	66.1694	12.24	20	474.3184	87.76	12.24
รายการปีเดียว	10	45.1774	4	1.9899	4.40	6	43.1875	95.60	4.40
รายการผูกพันใหม่	4	96.1571			-	4	96.1571	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	11	369.6576	1	34.6838	9.38	10	334.9738	90.62	9.38
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	12	29.4957	12	29.4957	100.00			-	100.00
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	7	30.7076	5	5.6426	18.38	2	25.0650	81.62	18.38
รายการปีเดียว	2	25.0650			-	2	25.0650	100.00	-
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	5	5.6426	5	5.6426	100.00			-	100.00
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	18	44.4118	14	10.1588	22.87	4	34.2530	77.13	22.87
รายการปีเดียว	5	34.3241	1	0.0711	0.21	4	34.2530	99.79	0.21
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	13	10.0877	13	10.0877	100.00			-	100.00
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน	23	55.1161	7	30.4160	55.19	16	24.7001	44.81	55.19
รายการปีเดียว	17	24.7901	1	0.0900	0.36	16	24.7001	99.64	0.36
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6	30.3260	6	30.3260	100.00			-	100.00
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	43	165.3423	20	76.7445	46.42	23	88.5978	53.58	46.42
รายการปีเดียว	38	154.9542	15	66.3564	42.82	23	88.5978	57.18	42.82
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	5	10.3881	5	10.3881	100.00			-	100.00

กระทรวง - หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม.
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	19	733.6691	7	348.0628	47.44	12	385.6063	52.56	47.44
รายการปีเดียว	13	385.7397	1	0.1334	0.03	12	385.6063	99.97	0.03
รายการผูกพันเดิม	2	246.7241	2	246.7241	100.00			-	100.00
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	4	101.2053	4	101.2053	100.00			-	100.00
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	12	133.5603	11	127.5423	95.49	1	6.0180	4.51	95.49
รายการปีเดียว	1	0.1460	1	0.1460	100.00			-	100.00
รายการผูกพันใหม่	1	6.0180			-	1	6.0180	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	1	120.4690	1	120.4690	100.00			-	100.00
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	9	6.9273	9	6.9273	100.00			-	100.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	5	35.0000	5	35.0000	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	5	35.0000	5	35.0000	100.00			-	100.00
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	9	181.8586	9	181.8586	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	8	44.0092	8	44.0092	100.00			-	100.00
รายการผูกพันเดิม	1	137.8494	1	137.8494	100.00			-	100.00
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	5	489.5357	5	489.5357	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	5	489.5357	5	489.5357	100.00			-	100.00
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	2	25.3635	2	25.3635	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	2	25.3635	2	25.3635	100.00			-	100.00
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	6	52.3252	6	52.3252	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	6	52.3252	6	52.3252	100.00			-	100.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	18	49.8794	11	8.8753	17.79	7	41.0041	82.21	17.79
รายการปีเดียว	7	41.0041			-	7	41.0041	100.00	-
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	11	8.8753	11	8.8753	100.00			-	100.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	276	1,076.0549	276	1,076.0549	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	270	344.9432	270	344.9432	100.00			-	100.00
รายการผูกพันใหม่	2	33.7857	2	33.7857	100.00			-	100.00
รายการผูกพันเดิม	4	697.3260	4	697.3260	100.00			-	100.00
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	47	364.6218	18	215.7003	59.16	29	148.9215	40.84	59.16
รายการปีเดียว	4	1.4454	1	0.3032	20.98	3	1.1422	79.02	20.98
รายการผูกพันใหม่	22	70.2452			-	22	70.2452	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	5	275.0477	1	197.5136	71.81	4	77.5341	28.19	71.81
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	16	17.8835	16	17.8835	100.00			-	100.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาดติจิทัล (องค์การมหาชน)	19	190.9113	17	138.8569	72.73	2	52.0544	27.27	72.73
รายการปีเดียว	18	189.7143	16	137.6599	72.56	2	52.0544	27.44	72.56
รายการผูกพันใหม่	1	1.1970	1	1.1970	100.00			-	100.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	2	123.7800	2	123.7800	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	2	123.7800	2	123.7800	100.00			-	100.00

กระทรวง - หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ก่อนแล้ว			ยังไม่ก่อน			สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม.
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	20	554.8628	4	55.3668	9.98	16	499.4960	90.02	9.98
รายการปีเดียว	14	244.2460			-	14	244.2460	100.00	-
รายการผูกพันใหม่	1	13.0000			-	1	13.0000	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	5	297.6168	4	55.3668	18.60	1	242.2500	81.40	18.60
สำนักงานคณะกรรมการการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	13	259.0175	13	259.0175	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	12	258.0293	12	258.0293	100.00			-	100.00
รายการผูกพันเดิม	1	0.9882	1	0.9882	100.00			-	100.00
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ สร้างความสามัคคีปรองดอง	2	4.1747	1	3.5447	84.91	1	0.6300	15.09	84.91
รายการปีเดียว	2	4.1747	1	3.5447	84.91	1	0.6300	15.09	84.91
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ	15	102.5667	5	7.2619	7.08	10	95.3048	92.92	7.08
รายการปีเดียว	13	24.7526	5	7.2619	29.34	8	17.4907	70.66	29.34
รายการผูกพันเดิม	2	77.8141			-	2	77.8141	100.00	-
กระทรวงกลาโหม	3,465	47,577.3145	2,193	22,788.9262	47.90	1,272	24,788.3883	52.10	47.90
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	101	2,380.5380	59	1,496.6980	62.87	42	883.8400	37.13	62.87
รายการปีเดียว	91	818.4490	54	464.5328	56.76	37	353.9162	43.24	56.76
รายการผูกพันใหม่	3	424.1590			-	3	424.1590	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	7	1,137.9300	5	1,032.1652	90.71	2	105.7648	9.29	90.71
กองทัพบก	153	16,053.7677	62	5,437.6775	33.87	91	10,616.0902	66.13	33.87
รายการปีเดียว	133	11,115.1298	58	2,917.8566	26.25	75	8,197.2732	73.75	26.25
รายการผูกพันใหม่	5	509.2309			-	5	509.2309	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	15	4,429.4070	4	2,519.8209	56.89	11	1,909.5861	43.11	56.89
กองทัพเรือ	590	11,945.3517	513	7,763.7842	64.99	77	4,181.5675	35.01	64.99
รายการปีเดียว	558	6,142.8000	502	5,489.4101	89.36	56	653.3899	10.64	89.36
รายการผูกพันใหม่	8	981.7500			-	8	981.7500	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	24	4,820.8017	11	2,274.3741	47.18	13	2,546.4276	52.82	47.18
กองทัพอากาศ	602	12,514.1327	362	5,212.3152	41.65	240	7,301.8175	58.35	41.65
รายการปีเดียว	578	4,654.6158	354	3,809.4115	81.84	224	845.2043	18.16	81.84
รายการผูกพันใหม่	6	3,650.5000			-	6	3,650.5000	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	18	4,209.0169	8	1,402.9037	33.33	10	2,806.1132	66.67	33.33
กองบัญชาการกองทัพไทย	2,009	4,035.8564	1,193	2,866.1537	71.02	816	1,169.7027	28.98	71.02
รายการปีเดียว	2,004	3,358.0556	1,190	2,538.3529	75.59	814	819.7027	24.41	75.59
รายการผูกพันใหม่	2	350.0000			-	2	350.0000	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	3	327.8008	3	327.8008	100.00			-	100.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	10	647.6680	4	12.2976	1.90	6	635.3704	98.10	1.90
รายการปีเดียว	10	647.6680	4	12.2976	1.90	6	635.3704	98.10	1.90
กระทรวงการคลัง	502	17,667.8216	365	15,934.2407	90.19	137	1,733.5809	9.81	90.19
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	19	337.5481	12	282.9329	83.82	7	54.6152	16.18	83.82
รายการปีเดียว	9	330.6183	2	276.0031	83.48	7	54.6152	16.52	83.48
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	10	6.9298	10	6.9298	100.00			-	100.00
กรมธนารักษ์	37	5,067.7521	28	4,716.9440	93.08	9	350.8081	6.92	93.08
รายการปีเดียว	11	427.4606	2	76.6525	17.93	9	350.8081	82.07	17.93
รายการผูกพันเดิม	2	4,573.0613	2	4,573.0613	100.00			-	100.00
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	24	67.2302	24	67.2302	100.00			-	100.00

กระทรวง - หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม.
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	
กรมบัญชีกลาง	113	634.7605	93	489.3065	77.09	20	145.4540	22.91	77.09
รายการปีเดียว	110	456.0208	90	310.5668	68.10	20	145.4540	31.90	68.10
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	3	178.7397	3	178.7397	100.00			-	100.00
กรมศุลกากร	68	1,614.1044	43	1,115.4002	69.10	25	498.7042	30.90	69.10
รายการปีเดียว	49	532.7828	27	124.3201	23.33	22	408.4627	76.67	23.33
รายการผูกพันใหม่	3	90.2415			-	3	90.2415	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	10	348.2577	10	348.2577	100.00			-	100.00
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6	642.8224	6	642.8224	100.00			-	100.00
กรมสรรพสามิต	28	8,473.0449	15	8,279.2716	97.71	13	193.7733	2.29	97.71
รายการปีเดียว	22	8,325.7672	10	8,133.5376	97.69	12	192.2296	2.31	97.69
รายการผูกพันใหม่	1	16.3205	1	16.3205	100.00			-	100.00
รายการผูกพันเดิม	5	130.9572	4	129.4135	98.82	1	1.5437	1.18	98.82
กรมสรรพากร	207	1,023.4629	152	645.8616	63.11	55	377.6013	36.89	63.11
รายการปีเดียว	205	976.3569	150	598.7556	61.33	55	377.6013	38.67	61.33
รายการผูกพันเดิม	2	47.1060	2	47.1060	100.00			-	100.00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	6	23.7048	6	23.7048	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	3	20.1330	3	20.1330	100.00			-	100.00
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	3	3.5718	3	3.5718	100.00			-	100.00
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	5	31.0179	3	16.9179	54.54	2	14.1000	45.46	54.54
รายการปีเดียว	3	17.8500	1	3.7500	21.01	2	14.1000	78.99	21.01
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	2	13.1679	2	13.1679	100.00			-	100.00
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	14	236.4260	8	137.9012	58.33	6	98.5248	41.67	58.33
รายการปีเดียว	11	226.0958	5	127.5710	56.42	6	98.5248	43.58	56.42
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	3	10.3302	3	10.3302	100.00			-	100.00
สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	5	226.0000	5	226.0000	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	5	226.0000	5	226.0000	100.00			-	100.00
กระทรวงการต่างประเทศ	590	451.0076	437	199.8695	44.32	153	251.1381	55.68	44.32
สำนักงานปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	590	451.0076	437	199.8695	44.32	153	251.1381	55.68	44.32
รายการปีเดียว	578	337.9809	427	139.6822	41.33	151	198.2987	58.67	41.33
รายการผูกพันเดิม	2	52.8394			-	2	52.8394	100.00	-
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	10	60.1873	10	60.1873	100.00			-	100.00
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,104	1,638.2879	827	654.0197	39.92	277	984.2682	60.08	39.92
สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	372	121.7707	323	42.4537	34.86	49	79.3170	65.14	34.86
รายการปีเดียว	339	92.9080	290	13.5910	14.63	49	79.3170	85.37	14.63
รายการผูกพันเดิม	28	24.8536	28	24.8536	100.00			-	100.00
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	5	4.0091	5	4.0091	100.00			-	100.00
กรมพลศึกษา	53	178.6078	20	32.5147	18.20	33	146.0931	81.80	18.20
รายการปีเดียว	52	177.8451	19	31.7520	17.85	33	146.0931	82.15	17.85
รายการผูกพันเดิม	1	0.7627	1	0.7627	100.00			-	100.00
กรมการท่องเที่ยว	39	463.9427	9	110.7838	23.88	30	353.1589	76.12	23.88
รายการปีเดียว	19	324.4595	6	92.5018	28.51	13	231.9577	71.49	28.51
รายการผูกพันใหม่	5	73.2638			-	5	73.2638	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	11	64.5472	3	18.2820	28.32	8	46.2652	71.68	28.32

กระทรวง - หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ก่อนนี้แล้ว			ยังไม่ก่อนนี้			สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ครม.
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	4	1.6722			-	4	1.6722	100.00	-
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	605	793.0147	441	387.5630	48.87	164	405.4517	51.13	48.87
รายการปีเดียว	596	667.6081	436	314.4924	47.11	160	353.1157	52.89	47.11
รายการผูกพันใหม่	4	52.3360			-	4	52.3360	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	5	73.0706	5	73.0706	100.00			-	100.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	35	80.9520	34	80.7045	99.69	1	0.2475	0.31	99.69
รายการปีเดียว	15	75.9308	15	75.9308	100.00			-	100.00
รายการผูกพันใหม่	2	0.4720	2	0.4720	100.00			-	100.00
รายการผูกพันเดิม	18	4.5492	17	4.3017	94.56	1	0.2475	5.44	94.56
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	503	2,387.4617	357	2,099.3841	87.93	146	288.0776	12.07	87.93
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	53	170.8413	37	90.3797	52.90	16	80.4616	47.10	52.90
รายการปีเดียว	50	126.3213	35	58.8797	46.61	15	67.4416	53.39	46.61
รายการผูกพันใหม่	1	13.0200			-	1	13.0200	100.00	-
รายการผูกพันเดิม	2	31.5000	2	31.5000	100.00			-	100.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	52	114.5213	43	52.2783	45.65	9	62.2430	54.35	45.65
รายการปีเดียว	52	114.5213	43	52.2783	45.65	9	62.2430	54.35	45.65
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	63	35.1755	44	14.3490	40.79	19	20.8265	59.21	40.79
รายการปีเดียว	62	29.1755	44	14.3490	49.18	18	14.8265	50.82	49.18
รายการผูกพันใหม่	1	6.0000			-	1	6.0000	100.00	-
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	154	100.2297	145	72.1069	71.94	9	28.1228	28.06	71.94
รายการปีเดียว	150	81.1466	145	72.1069	88.86	5	9.0397	11.14	88.86
รายการผูกพันใหม่	4	19.0831			-	4	19.0831	100.00	-
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	4	1,109.8200	4	1,109.8200	100.00			-	100.00
รายการปีเดียว	4	1,109.8200	4	1,109.8200	100.00			-	100.00
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ	25	232.5131	13	212.5007	91.39	12	20.0124	8.61	91.39
รายการปีเดียว	24	207.9643	12	187.9519	90.38	12	20.0124	9.62	90.38
รายการผูกพันเดิม	1	24.5488	1	24.5488	100.00			-	100.00
กรมกิจการผู้สูงอายุ	152	624.3608	71	547.9495	87.76	81	76.4113	12.24	87.76
รายการปีเดียว	152	624.3608	71	547.9495	87.76	81	76.4113	12.24	87.76
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	19,310	89,019.7344	16,567	75,215.7961	84.49	2,743	13,803.9383	15.51	84.49
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	407	148.9941	393	131.2272	88.08	14	17.7669	11.92	88.08
รายการปีเดียว	396	136.6475	382	118.8806	87.00	14	17.7669	13.00	87.00
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	11	12.3466	11	12.3466	100.00			-	100.00
กรมชลประทาน	10,797	77,659.3835	10,240	69,815.2643	89.90	557	7,844.1192	10.10	89.90
รายการปีเดียว	10,625	64,266.9289	10,105	59,037.6128	91.86	520	5,229.3161	8.14	91.86
รายการผูกพันใหม่	54	2,834.3240	21	586.5520	20.69	33	2,247.7720	79.31	20.69
รายการผูกพันเดิม	118	10,558.1306	114	10,191.0995	96.52	4	367.0311	3.48	96.52
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	300	91.5595	281	87.9875	96.10	19	3.5720	3.90	96.10
รายการปีเดียว	292	79.3852	273	75.8132	95.50	19	3.5720	4.50	95.50
งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	8	12.1743	8	12.1743	100.00			-	100.00
กรมประมง	435	482.3423	410	264.3387	54.80	25	218.0036	45.20	54.80



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ โทร. ๒๒๒๙

ที่ กพง ๐๔/๒๒๔๓ / ๒๕๖๘

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน รองอธิบดี

ตามที่กองแผนงานได้แจ้งแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (หนังสือที่ กพง๐๖/๕๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้กรมชลประทานสามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงขอให้หน่วยงานปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานปฏิบัติตรวจสอบรายการงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ทำข้อผูกพัน ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔

๒. ให้หน่วยงานปฏิบัติตรวจสอบรายการงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถ ดำเนินการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ (ยกเลิก) และคาดการณ์เงินเหลือจ่ายทุกกรณี แจ้งคืน กองแผนงาน เพื่อดำเนินการ โอนเงินจัดสรรเหลือจ่ายดังกล่าวไปชำระหนี้ตามกฎหมายและใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ต่อไป

๓. กรณีที่หน่วยงานปฏิบัติ มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการงานพระราชดำริ งานนโยบาย งานที่จำเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยงานปฏิบัติจัดส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น (ประมาณการ ขป.๓๒๕ รายการคำนวณ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) พร้อมทั้งแนบไฟล์ PDF ส่งทาง E-mail : bpd.rid@gmail.com

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติต่อไป

(นายสุริยพล นุชอนงค์)

อช.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๕๕๒/๒๕๖๓ วันที่ ๓๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้กรมสามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันมิให้งบประมาณถูกพับ และสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		สิ้นไตรมาสที่ ๑		สิ้นไตรมาสที่ ๒		สิ้นไตรมาสที่ ๓		สิ้นไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒. ให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้โดยเร็ว ดังนี้

๒.๑ กรณีงานปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑) และใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๔)

๒.๒ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๒) และใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๔)

๓. ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเลิก) แจ้งคืนกองแผนงานโดยเร็ว เพื่อดำเนินการโอนเงินจัดสรรดังกล่าวไปชำระหนี้ตามกฎหมายและใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ต่อไป

๔. กรณี ...

๔. กรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการงานพระราชดำริ งานนโยบาย งานที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ให้จัดส่ง เอกสารขอรับการสนับสนุนพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น (ประมาณการ ขป.๓๒๕ รายการคำนวณ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) มายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ



(นายสุริยพล นุชอนงค์)

รศ. รักษาราชการแทน อธช.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(งบ พ.ร.บ.)



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568



2.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568



ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project II
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568

2.1 สรุปผลการก่อกั้นผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2568



งบลงทุน



รวม

รายการ **11,614**



งบประมาณ (พ.ร.บ.)

76,122.82

ล้านบาท



งบประมณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง

75,077.52

ล้านบาท

พ.ร.บ. 68 ไม่รวม
โอนเปลี่ยนแปลง



10,787

รายการ

งบประมาณ (พ.ร.บ.)



76,122.82

ล้านบาท



70,798.13 ล้านบาท



โอนเปลี่ยนแปลง

827

รายการ


งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง

4,279.39 ล้านบาท



ยังไม่ดำเนินการ

1



1.50

1.50

➢ พ.ร.บ. 68 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

-

➢ โอนเปลี่ยนแปลง

1



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

20



776.27

720.35

55.92

➢ พ.ร.บ. 68 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

11

➢ โอนเปลี่ยนแปลง

9



ก่อกั้นผูกพัน

11,380



74,296.65

70,074.68

4,221.97

➢ พ.ร.บ. 68 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

10,563

➢ โอนเปลี่ยนแปลง

817



ผลการก่อกั้นผูกพัน

แล้วเสร็จ จำนวน 10,523 รายการ
งบประมาณ 41,671.18 ล้านบาท

ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 11,380 รายการ (99.82%)
งบประมาณ 74,296.65 ล้านบาท (98.96%)



ปัญหา/อุปสรรค

1. ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างกลางครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ไม่ผ่านคุณสมบัติ/มีผู้เสนอรายเดียว
2. แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ ได้แก่ ทบทวนราคากลาง แก้ไขแบบรูปรายการ และเผยแพร่ร่าง TOR แล้วมีผู้วิจารณ์
3. การดำเนินการโอนเงินจัดสรร (เปลี่ยนแปลง) อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 20 รายการ (0.17%) งบประมาณ 776.27 ล้านบาท (1.03%)

- อนุมัติแผน 8 รายการ งบประมาณ 26.92 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ งบประมาณ 421.81 ล้านบาท
- เปิดซอง 5 รายการ งบประมาณ 208.28 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 3 รายการ งบประมาณ 119.26 ล้านบาท



ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ (0.01%)
งบประมาณ 1.50 ล้านบาท (0.002%)



ยังไม่ดำเนินการ



อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ก่อกั้นผูกพัน



ยกเลิก



! ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน 21 รายการ

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง - อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	11,398	74,835.03	1	1.50	8	26.92	4	421.81	8	327.54	11,377	74,057.26
กพท.	184	11,149.04									184	11,149.04
สพญ.	227	14,369.05					3	392.81			224	13,976.24
สศก.	240	2,580.16							8	327.54	232	2,252.62
สบอ.	211	551.64									211	551.64
สบก.	57	713.45									57	713.45
สจต.	50	310.84									50	310.84
สลก.	5	80.96									5	80.96
สสร.	40	681.47									40	681.47
สอส.	39	379.21									39	379.21
สมต.	46	2,698.84									46	2,698.84
ศทส.	1	39.17									1	39.17
กผง.	1	0.06									1	0.06
กงบ.	1	0.02									1	0.02



- ยังไม่ดำเนินการ
- อนุมัติแผน - ประกาศ TOR
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซอง - อนุมัติรับราคา
- ทำข้อผูกพัน

! รายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน 21 รายการ งบประมาณ 777.77 ล้านบาท

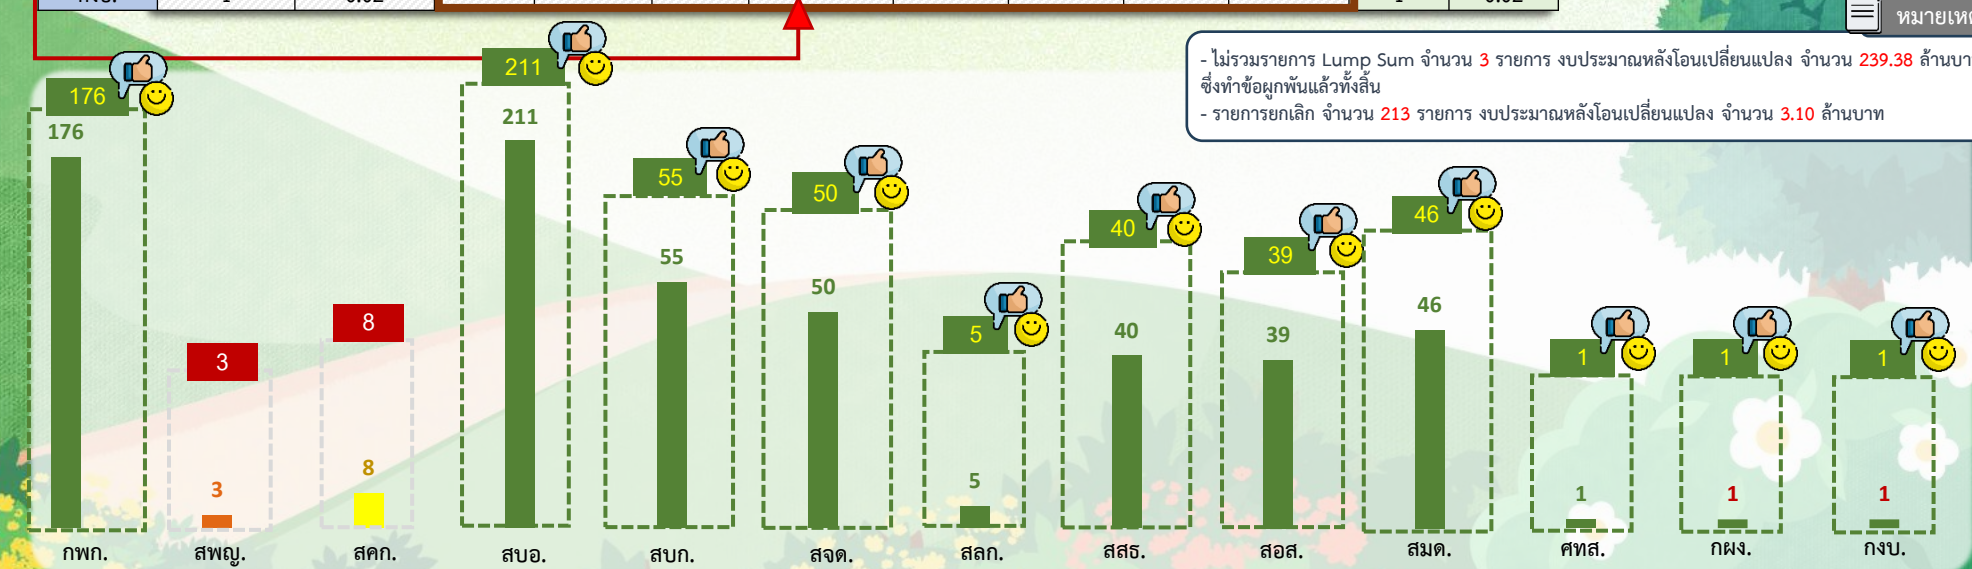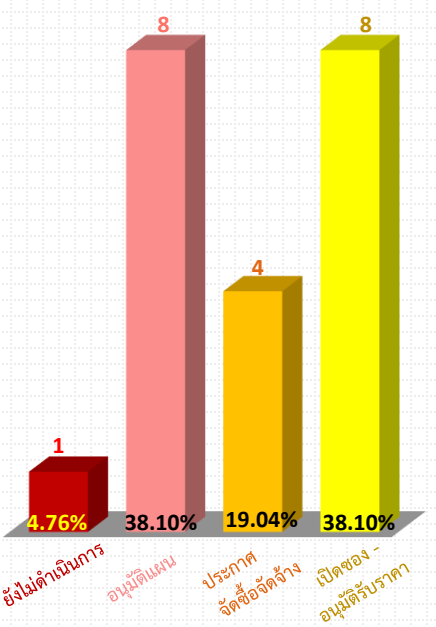

หมายเหตุ
 - ไม่รวมรายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 239.38 ล้านบาท ซึ่งทำข้อผูกพันแล้วทั้งสิ้น
 - รายการยกเลิก จำนวน 213 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 3.10 ล้านบาท



2.2

สรุปผลการก่อนผู้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2568 - ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568


⚠️ ยังไม่ก่อนผู้ผูกพัน 21 รายการ

⚠️ ยังไม่ก่อนผู้ผูกพัน 21 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก	จำนวนรายการ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง - อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	360	1,610.01									360	1,610.01
สขป. 2	508	2,252.35									508	2,252.35
สขป. 3	377	2,110.78					1	29.00			376	2,081.78
สขป. 4	545	2,175.50									545	2,175.50
สขป. 5	617	3,765.31									617	3,765.31
สขป. 6	706	3,318.69									706	3,318.69
สขป. 7	672	4,707.60			1	8.92					671	4,698.68
สขป. 8	808	3,622.93									808	3,622.93
สขป. 9	818	2,327.59									818	2,327.59

สำนัก	จำนวนรายการ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง - อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	801	1,723.55									801	1,723.55
สขป. 11	740	1,929.74	1	1.50							739	1,928.24
สขป. 12	932	2,397.24			7	18.00					925	2,379.24
สขป. 13	806	1,781.66									806	1,781.66
สขป. 14	370	2,202.90									370	2,202.90
สขป. 15	445	1,393.25									445	1,393.25
สขป. 16	508	2,624.98									508	2,624.98
สขป. 17	283	1,337.05									283	1,337.05

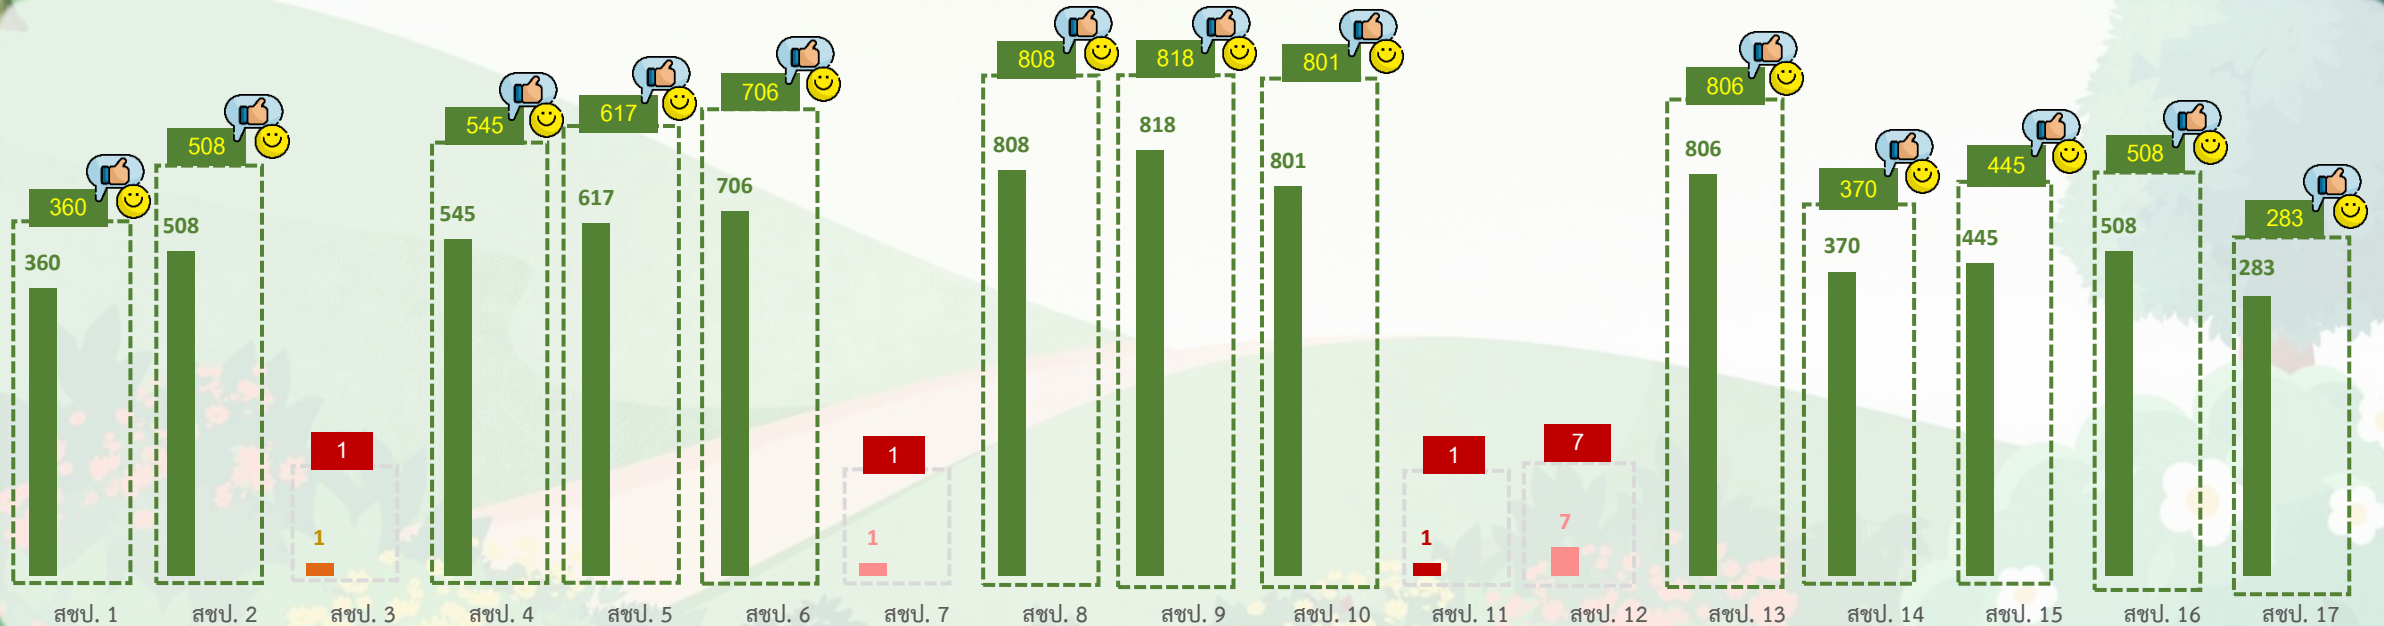




2.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568




เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส 4

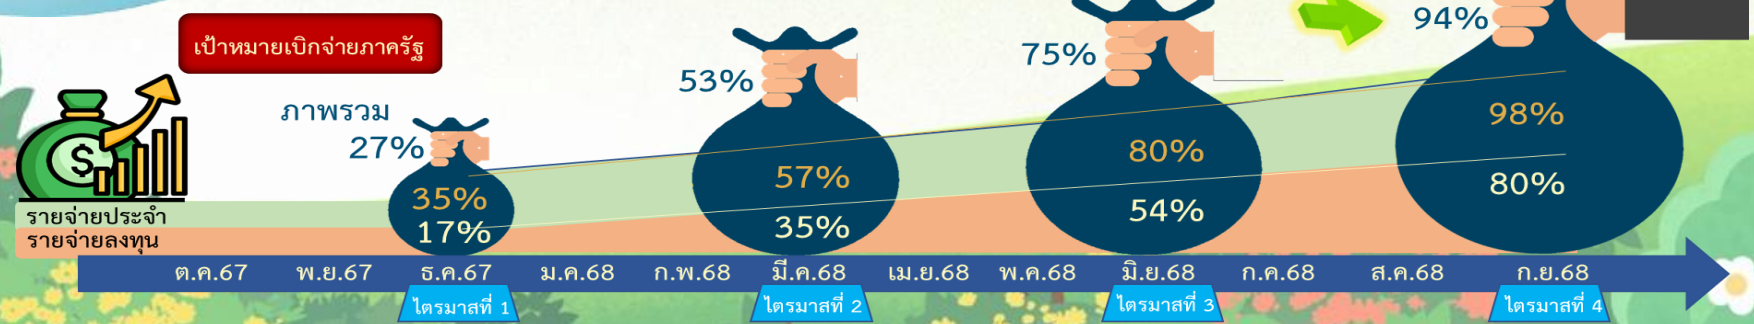

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568

82,746.72 ล้านบาท
ภาพรวม
เบิกจ่าย
72,631.28 ล้านบาท
87.78%

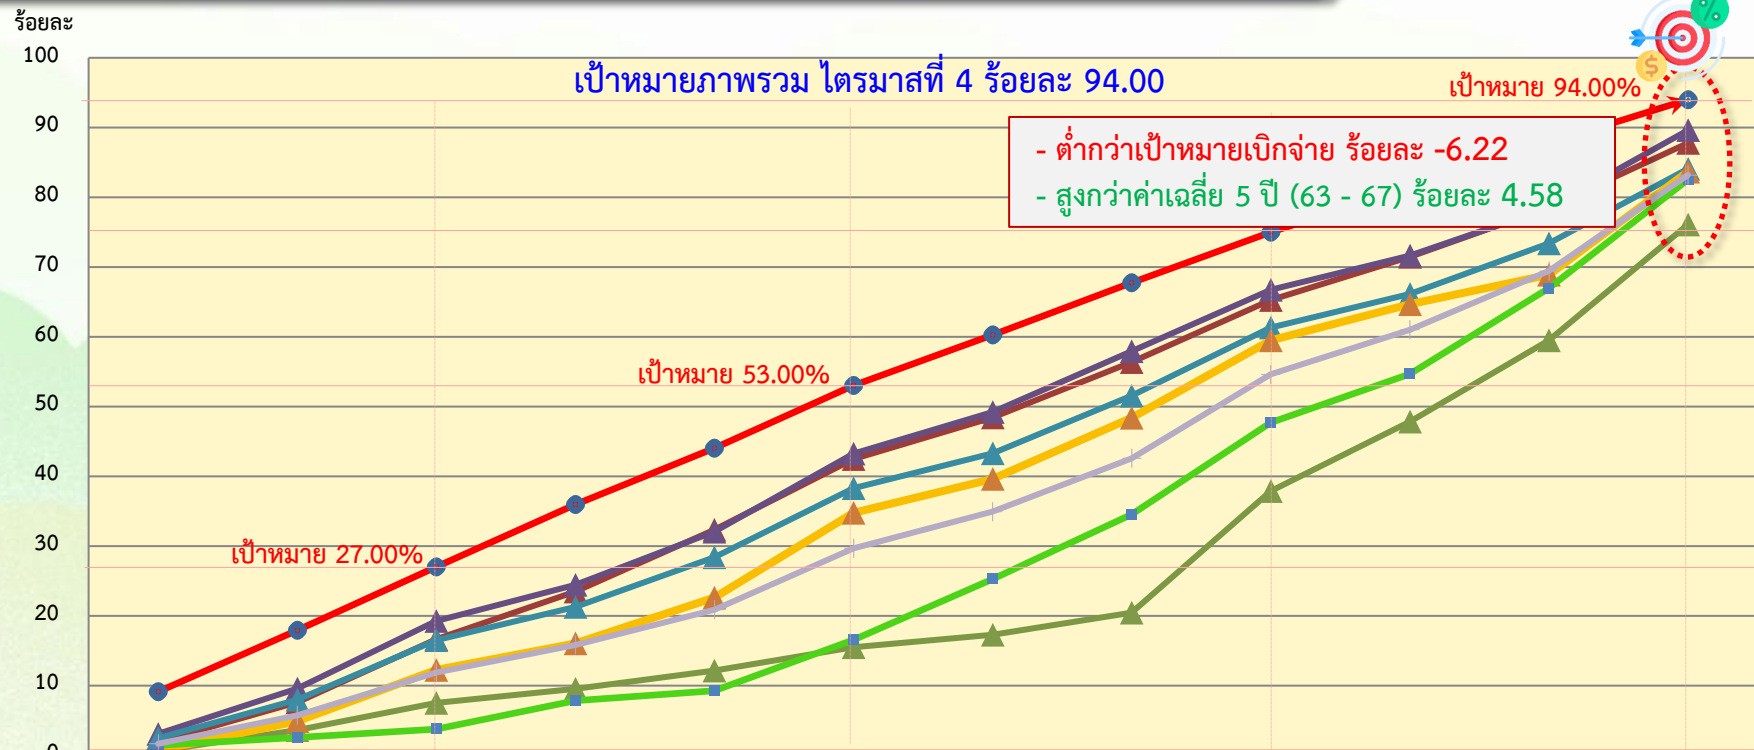

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (Q1)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (Q2)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย. (Q3)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย. (Q4)
● เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 68	9.10	17.90	27.00	35.96	44.04	53.00	60.25	67.75	75.00	81.40	87.80	94.00
▲ ผลปี 68 (82,746.72)	1.91	7.61	16.64	23.46	32.31	42.48	48.43	56.38	65.26	71.48	78.55	87.78
▲ ผลปี 67 (81,118.28)	0.60	3.60	7.49	9.52	12.13	15.51	17.29	20.42	37.87	47.85	59.48	76.10
▲ ผลปี 66 (77,494.48)	3.07	9.55	19.26	24.45	32.04	43.23	49.19	57.91	66.73	71.66	78.47	89.62
▲ ผลปี 65 (77,143.43)	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	66.15	73.38	84.09
▲ ผลปี 64 (74,106.98)	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
▲ ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
▲ เฉลี่ย 5 ปี (63-67)	1.64	5.72	11.85	15.82	20.88	29.67	34.92	42.56	54.62	61.00	69.44	83.20



2.5

สถิติการเบิกจ่าย **งบรายจ่ายลงทุน** ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2568

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568



ร้อยละ

100

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 80.00

เป้าหมาย 80.00%

- สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐ ร้อยละ 6.58
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (63 - 67) ร้อยละ 5.06

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 35.00%

เป้าหมาย 17.00%

75,673.68 ล้านบาท

ลงทุน

เบิกจ่าย

65,516.25 ล้านบาท

86.58%

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. (Q1)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. (Q2)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย. (Q3)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย. (Q4)
เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 68	5.73	11.27	17.00	23.20	28.80	35.00	41.26	47.74	54.00	62.72	71.52	80.00
ผล ปี 68 (76,324.86)	1.50	6.98	16.06	22.69	31.58	41.80	47.56	55.57	64.47	70.54	77.50	86.58
ผล ปี 67 (74,605.26)	0.03	2.44	5.95	7.45	9.53	12.32	13.56	20.25	34.54	44.62	56.62	73.89
ผลปี 66 (70,682.86)	2.68	8.95	18.71	23.53	30.98	42.48	48.24	57.04	65.95	70.58	77.24	88.62
ผลปี 65 (70,135.62)	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.80	82.46
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
เฉลี่ย 5 ปี (63 - 67)	1.08	4.65	10.51	14.03	18.76	27.58	32.57	40.98	52.68	58.85	67.35	81.52



2.6

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 2567

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	86,768.38	71,682.00	82.61	82,785.78	59,940.16	72.40	10.21
2	กระทรวงคมนาคม	180,148.35	144,141.34	80.01	170,836.37	126,723.07	74.18	5.83
3	กระทรวงมหาดไทย	104,312.35	58,970.12	56.53	129,249.13	70,558.14	54.59	1.94
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมชลประทาน	75,673.68	65,516.25	86.58	73,595.27	54,381.67	73.89	12.69
2	กรมพัฒนาที่ดิน	2,515.42	1,720.19	68.39	2,283.70	1,689.75	73.99	-5.60
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,610.80	1,059.47	65.77	1,458.15	1,014.32	69.56	-3.79
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	48,992.93	43,648.94	89.09	46,255.14	30,840.94	66.68	22.41
2	กรมชลประทาน	75,673.68	65,516.25	86.58	73,595.27	54,381.67	73.89	12.69
3	กรมทางหลวง	121,224.04	96,604.55	79.69	115,877.80	92,750.33	80.04	-0.35
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	40,465.81	15,532.26	38.38	36,685.49	16,232.62	44.25	-5.87

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568



- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 70.85%
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (58 หน่วยงาน) เฉลี่ย 70.40%

